

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Tímový projekt 1

Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer)

Dokumentácia riadenia pre zimný semester

Číslo tímu: 10

Členovia tímu: Bc. Peter Jurík, Bc. Ján Janičkovič, Bc. Jozef Vicen, Bc. Pavol Briš, Bc. Marián Bednár

Vedúci tímového projektu: Ing. Matej Jurikovič

Ročník, typ štúdia: 1, inžinierske štúdium

Akademický. rok: 2010/2011

Obsah

História dokumentu.....	4
1 Úvod.....	6
1.1 Účel a rozsah dokumentu.....	6
1.2 Prehľad dokumentu.....	6
2 Ponuka.....	7
2.1 Zadanie Projektu.....	7
2.2 Členovia tímu.....	7
Bc. Pavol Briš.....	7
Bc. Marián Bednár.....	7
Bc. Ján Janičkovič.....	8
Bc. Peter Jurík.....	8
Bc. Jozef Vicen.....	9
2.3 Motivácia.....	9
2.4 Návrh riešenia.....	10
2.5 Predpokladané zdroje.....	10
2.6 Témy projektov podľa priorit.....	11
2.7 Rozvrh členov tímu.....	12
3 Plán práce na projekte.....	14
3.1 Zimný semester.....	14
3.1.1 Úlohy členov tímu.....	15
3.1.1.1 Dlhodobé úlohy.....	15
3.1.1.2 Rozdelenie úloh tímu.....	16
3.1.1.3 Ganttov diagram s jednotlivými úlohami v tíme.....	20
3.1.2 Autorstvo častí dokumentácie k 13.12.2010.....	21
3.2 Letný semester.....	23
3.2.1 Úlohy členov tímu.....	24
3.2.1.1 Dlhodobé úlohy.....	24
3.2.1.2 Rozdelenie úloh tímu.....	25
3.2.1.3 Ganttov diagram s jednotlivými úlohami v tíme.....	30
3.2.2 Autorstvo častí dokumentácie.....	31
4 Komunikácia v tíme.....	32
4.1 Stretnutia tímu.....	32
4.2 Google groups.....	32
4.3 Webová stránka.....	32
4.4 Iná forma komunikácie.....	32
5 Zápisnice zo stretnutí.....	33
5.1 Zápisnica 1.....	33
5.2 Zápisnica 2.....	35
5.3 Zápisnica 3.....	37
5.4 Zápisnica 4.....	39
5.5 Zápisnica 5.....	41
5.6 Zápisnica 6.....	43
5.7 Zápisnica 7.....	45
5.8 Zápisnica 8.....	47

5.9	Zápisnica 9.....	49
5.10	Zápisnica 10.....	51
5.11	Zápisnica 11.....	53
5.12	Zápisnica 12.....	55
5.13	Zápisnica 13.....	57
5.14	Zápisnica 14.....	59
5.15	Zápisnica 15.....	61
5.16	Zápisnica 16.....	63
5.17	Zápisnica 17.....	65
5.18	Zápisnica 18.....	67
5.19	Zápisnica 19.....	69
5.20	Zápisnica 20.....	71
5.21	Zápisnica 21.....	73
6	Preberiacie protokoly	75

História dokumentu

Dátum zmeny	Verzia	Popis
6.10.2010	0.1	Založenie dokumentácie riadenia. Pridanie ponuky.
12.10.2010	0.2	Pridanie úvodu. Pridanie zápisnice 1, 2.
15.10.2010	0.3	Pridanie plánu projektu.
25.10.2010	0.4	Pridanie zápisnice 3, 4. Pridanie dlhodobých úloh členov tímu. Pridanie kapitoly o komunikácii v tíme.
8.11.2010	0.5	Pridanie zápisnice 5, 6. Pridanie kapitoly o rozdelení úloh v tíme. Pridanie Ganttovho diagramu.
10.11.2010	0.6	Pridanie autorstva kapitol v dokumentácii k projektu. Pridanie preberacích protokolov.
23.11.2010	0.7	Pridanie zápisnice 7, 8.
7.12.2010	0.8	Pridanie zápisnice 9, 10.
10.12.2010	0.9	Doplnenie kapitoly o rozdelení úloh v tíme .
12.12.2010	1.0	Doplnenie autorstva kapitol. Aktualizácia Ganttovho diagramu.
25.2.2011	1.1	Pridanie dlhodobých úloh v letnom semestri.
11.3.2011	1.2	Pridanie zápisnice 11,12,13.
26.3.2011	1.3	Pridanie zápisnice 14,15.
18.4.2011	1.4	Pridanie zápisnice 16,17,18,19. Doplnenie kapitoly o rozdelení úloh v tíme .

		Doplnenie autorstva kapitol. Pridanie Ganttovho diagramu.
	1.5	Pridanie zápisnice 20,21. Aktualizácia kapitoly o rozdelení úloh v tíme. Aktualizácia Ganttovho diagramu.

1 Úvod

Úvodom sa pozrieme na účel dokumentu a prehľad jeho častí.

1.1 Účel a rozsah dokumentu

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť čitateľovi informácie o riadení tímu počas práce na projekte na predmete Tímový projekt 1.

1.2 Prehľad dokumentu

Dokument má nasledovnú štruktúru:

Kapitola 1: Účel a prehľad dokumentu

Kapitola 2: Ponuka

Kapitola 3: Plán projektu

Kapitola 4: Komunikácia

Kapitola 5: Zápisnice

Kapitola 6: Preberacie protokoly

2 Ponuka

V tejto kapitole je uvedená ponuka k téme „Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania“

2.1 Zadanie Projektu

Analyzujte možnosti počítačov HP Tablet PC ako aj existujúce komerčné a nekomerčné aplikácie, ktoré podporujú ich špecifické vlastnosti. Analyzujte možnosti ich využitia v oblasti návrhu a modelovania digitálnych systémov (napr. v predmetoch Logické obvody, Opis a návrh digitálnych systémov a pod.).

Na základe analýzy navrhnete a implementujete programový systém využívajúci špecifické vlastnosti počítačov HP Tablet PC, ktorý bude podporovať inováciu vyučovania či už vo všeobecnosti alebo bude zameraný na využitie v konkrétnom predmete študijného programu PKSS.

Každý tím dostane k dispozícii HP Tablet PC na testovanie prototypu aj výslednej aplikácie.

2.2 Členovia tímu

Bc. Pavol Briš

Počas svojho štúdia získal skúsenosti so správou rôznych operačných systémov vrátane OS Windows. Ovláda programovacie jazyky C++, Shell a základy jazyka Python. Pomerne slušne ovláda tvorbu dynamických webových aplikácií, presnejšie XHTML, CSS, PHP, MySQL a JavaScript.

Bc. Marián Bednár

Programovanie zručnosti: C/C++, HTML, Flash, PHP, MySQL, CSS.

Absolvované predmety: Logické obvody, Interakcia človeka s počítačom, Procedurálne programovanie, Objektovo - orientované programovanie.

Cieľ bakalárskej práce bolo vytvoriť multimedialny programový systém na podporu výuky syntézy synchronných sekvenčných obvodov pod vedením Ing. Eleny Tomalovej. Pri tvorbe práce získané skúsenosti s tvorbou webu a vizualizáciou konečných automatov pri syntéze sekvenčných logických obvodov. Práca bola hodnotená stupňom A. E-mail: majo.bednar@gmail.sk

Bc. Ján Janičkovič

- prvý ročník inžinierskeho štúdia na FIIT, študijný program Počítačové a komunikačné systémy a siete
- nadobudnuté vedomosti:
 - skúsenosti s vývojom a údržbou rozsiahlejších aplikácií
 - oboznámený s aplikáciou podporujúcou Tablet PC
 - znalosť objektovo-orientovaného programovania
 - skúsenosti s návrhom a implementáciou webových aplikácií, aplikácií typu klient-server

Bc. Peter Jurík

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave v študijnom programe Informatika. Bakalársku prácu vypracoval pod vedením Ing. Jána Mátého. Témou práce bola “Optimalizácia využitia kapacity dátového úložiska pri e-mailovej komunikácii”. Počas štúdia získal vedomosti z programovacích jazykov C, C#, Java, HTML, UML a Perl, z databázových technológií ako PostgreSQL a z počítačových sietí v rôznom rozsahu. Má skúsenosti v oblasti administrácie OS Unix/Linux a MS Windows, administrácie sietí a tvorby softvéru pre platformy Linux/Windows. V súčasnosti svoje vedomosti a skúsenosti využíva vo firme, ktorá pôsobí v oblasti správy počítačových systémov a sietí.

Bc. Jozef Vicen

Absolvent študijného programu Počítačové systémy a siete bakalárskeho štúdia na FIIT STU Bratislava. Má skúsenosti v oblasti návrhu a tvorby webových stránok s použitím jazyka HTML, Flash a CSS. Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazyku C, C++, C#, Delphi a Java. Témou jeho bakalárskej práce bola "Podpora výučby problematiky Petriho sietí – HTML aplikácia" v ktorej získal skúsenosti s tvorbou aplikácií pre podporu výučby, ktoré bude možné využiť pri riešení konkrétneho projektu.

2.3 Motivácia

Vzhľadom na množstvo oblastí, v ktorých by bolo možné vylepšiť alebo zefektívniť vyučovací proces je zvolená téma projektu výzvou pre náš tím ako navrhnúť a implementovať riešenie, ktoré by za pomoci pokročilých technológií ako Tablet PC prispelo k zvýšeniu interaktivity pri vzdelávaní sa všeobecne alebo konkrétne v niektorom predmete študijného programu počítačové a komunikačné systémy a siete.

Daná téma je vhodná pre využitie znalostí, vzdelávacích prostriedkov a kreativity všetkých členov tímu z rôznych oblastí informačných technológií. Téma zahŕňa oboznámenie sa s najnovšími hardvérovými riešeniami až po implementáciu riešenia pomocou rôznorodých programovacích prostriedkov.

Po zohľadnení vedomostí a skúseností každého jednotlivca z tímu je zrejmé, že náš tím je vhodným kandidátom na riešenie zvolenej témy a môže do oblasti vzdelávania priniesť kvalitné a inovatívne postupy a riešenia.

2.4 Návrh riešenia

Navrhovaný systém bude poskytovať podporu vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. Zjednoduší proces výkladu nového učiva, poskytne nástroje, pomocou ktorých sa bude dať učivo precvičiť na konkrétnych príkladoch a systém sa bude samozrejme využívať aj na testovanie a hodnotenie študentov.

Pri prednáškach bude mať prednášajúci k dispozícii možnosť interaktívneho dopĺňania poznámok do výučbového materiálu. Tieto poznámky bude možnosť vkladať pomocou tabletu do ľubovoľného obsahu, teda napríklad do prezentácií, obrázkov alebo do videa. Takáto možnosť zabezpečí často potrebné upravenie výkladu prednášajúceho podľa momentálnych potrieb.

2.5 Predpokladané zdroje

Základnou a nevyhnutnou potrebou pri implementácii navrhnutého systému je možnosť overenia funkcionality systému na HP Tablet PC. Pri takomto testovaní je potrebné zistiť špecifické odozvy dotykového rozhrania tohto zariadenia a implementovaný systém podľa potreby prispôbovať.

Ďalšou požiadavkou je časové obdobie, počas ktorého bude projekt realizovaný. Toto obdobie zahŕňa čas na samotné vypracovanie projektu, teda na analýzu problémovej oblasti, návrh riešenia, implementáciu a dokumentáciu ale aj na organizačné činnosti v rámci tímu kde čas bude určený s ohľadom na rozvrh každého jednotlivca v tíme.

Z pohľadu implementácie budú potrebné počítače s príslušným implementačným prostredím na zabezpečenie samotného programovania softvérového produktu.

2.6 Témy projektov podľa priorít

- Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania
- Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania predmetu Testovateľnosť digitálnych systémov
- Programová podpora pre sieťový simulátor
- Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom
- Simulátor komunikácie v počítačovej sieti
- Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte
- Diagnostika porúch diskretných udalostných systémov založená na modeloch aplikácie v informatike
- Prostredie pre návrh digitálnych systémov
- Návrh vnoreného systému (Embedded Development)

2.7 Rozvrh členov tímu

Marián Bednár

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														

Pavol Briš

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														

Ján Janičkovič

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														

Peter Jurík

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														


Jozef Vícen


	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														


Navrhovaný termín stretnutí tímového projektu

	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50	13:50	14:50	15:50	16:50	17:50	18:50	19:50	20:50
Po:														
Ut:														
St:														
Št:														
Pi:														

Legenda:

 - prednáška

 - cvičenie

 - preferované termíny stretnutí k TP 1

3 Plán práce na projekte

V tejto kapitole je podrobne rozpísaná práca jednotlivých členov na projekte. Sú tu uvedené dlhodobé ako aj krátkodobé úlohy členov a plán práce pre jednotlivé semestre.

3.1 Zimný semester

1. Vytvorenie ponuky na zvolenú tému
2. Odovzdanie ponuky a jej prezentácia
3. Vyhodnotenie ponuky, pridelenie témy, určenie rozvrhu a miesta stretávania a vytvorenie plánu projektu
4. Analýza problémovej oblasti
5. Analýza a špecifikácia požiadaviek
6. Analýza a návrh systému
7. Tvorba dokumentácie riadenia
8. Odovzdanie dokumentácie k projektu a dokumentácie k riadeniu projektu vedúcemu a posudzujúcemu tímu
9. Vypracovanie a odovzdanie posudku na dokumentáciu iného tímu
10. Úprava dokumentácie podľa zistených nedostatkov
11. Návrh a implementácia prototypu vybraných častí systému
12. Odovzdanie a prezentácia prototypu
13. Odovzdanie finálnej dokumentácie k projektu a dokumentácie k riadeniu projektu za zimný semester
14. Vypracovanie a odovzdanie posudku na prototyp iného tímu

3.1.1 Úlohy členov tímu

3.1.1.1 Dlhodobé úlohy

- **Bc. Peter Jurík**
 - analýza problémovej oblasti a požiadaviek na systém
 - tvorba dokumentácie
 - tvorba dokumentácie riadenia
 - vedúci tímu
- **Bc. Marián Bednár**
 - analýza problémovej oblasti a návrhu systému
 - tvorba dokumentácie
 - správa web stránky
- **Bc. Pavol Briš**
 - analýza problémovej oblasti
 - tvorba dokumentácie
 - testovanie softvérových nástrojov
- **Bc. Ján Janičkovič**
 - analýza problémovej oblasti a návrhu systému
 - tvorba dokumentácie
 - správa nástrojov pre riadenie projektu
- **Bc. Jozef Vicen**
 - analýza problémovej oblasti
 - tvorba dokumentácie
 - integrácia dokumentácie

3.1.1.2 Rozdelenie úloh tímu

Bc. Peter Jurík

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
0	Vypracovanie ponuky.	3	
1.1	Založenie projektového denníku.	0.25	1
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	2	1
2.5	Analýza súborového systému BDS.	9.5	2, 3
4.5	Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS.	3	4
5.3	Ďalšie spracovanie návrhu rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	1.5	6
5.5	Špecifikácia požiadaviek na systém.	4	5
6.5	Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia.	5	6
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	0.5	6
7.8	Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia.	1.5	7
8.7	Analýza programu Metropolis.	8	8
9.3	Doplniť dokumentáciu riadenia.	4	10


Bc. Marián Bednár

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
0	Vypracovanie ponuky.	2	
1.1	Založenie projektového denníku.	0.5	1
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	1.5	1
2.1	Analýza súborového systému BLIFF a vytvorenie webovej stránky.	6.75	2
3.1	Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné	2.5	3, 4
5.1	Návrh pridávania funkčných celkov(pluginov) do nášho systému. Doplniť web.	3	5
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	3	6
6.1	Doplniť web	0.5	6
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	0.5	6
7.1	Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2.	3	7
7.2	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia.	0.5	7
8.1	Analýza programu Ptolemy 2.	10	8
9.1	Doplnenie návrhu systému.	1	10

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
0	Vypracovanie ponuky.	2.5	
1.1	Založenie projektového denníku.	1	1
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	3	1
2.2	Analýza súborového systému SLIFF.	4	2
3.2	Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové automaty a Petriho siete.	3	3
4.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF.	2	4
5.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy.	4	5
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	0.5	6
6.2	Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty.	5	6
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	0.5	6
7.3	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu	1	7
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	1	7
8.2	Analýza programu ForSyDe.	7	8
8.3	Doplniť informácie o MVSIS.	1	8
9.1	Doplnenie návrhu systému.	1	10

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
0	Vypracovanie ponuky.	2	
1.1	Založenie projektového denníku.	1	1
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	2.25	1
2.3	Analýza softvérových nástrojov použitých pri riešení projektu.	8	2
3.3	Príprava softvérových nástrojov na správu projektu.	4	3
4.3	Postupná integrácia analýzy súborových systémov.	2	4
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	4	5, 6
6.3	Analýza editorov.	2	6
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	0.5	6
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	11	7
7.5	Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy.	2.5	7
8.4	Analýza programu BlueSpec.	13	8
9.2	Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému.	2	10

3.1.1.3 Ganttov diagram s jednotlivými úlohami v tíme

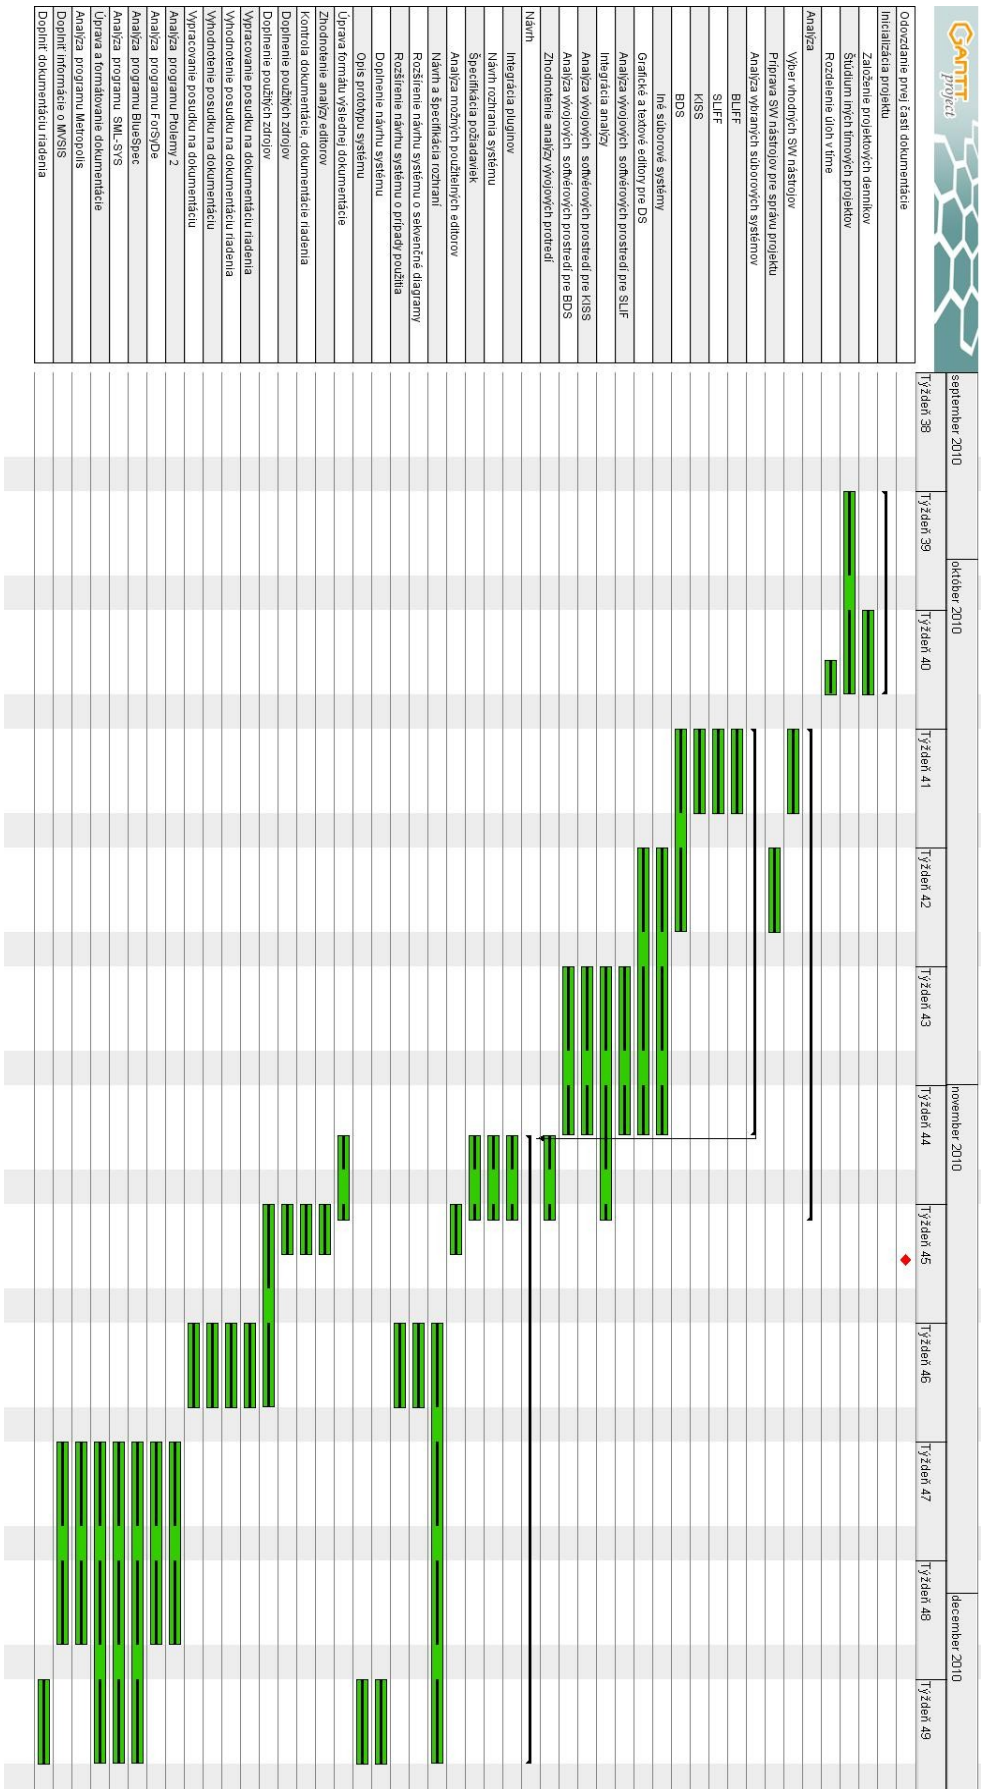

3.1.2 Autorstvo častí dokumentácie k 13.12.2010

Kapitola	Názov	Autor
1	Úvod	Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič
2, 2.1	Analýza	Všetci členovia tímu
2.1.1	PLA	Bc. Marián Bednár
2.1.2	BLIF	Bc. Marián Bednár
2.1.3	KISS	Bc. Jozef Vicen
2.1.4	EQN	Bc. Jozef Vicen
2.1.5	SLIF	Bc. Pavol Briš
2.1.6	Vzájomné porovnanie	Bc. Jozef Vicen
2.2	Simulátory Petriho sietí	Bc. Pavol Briš
2.3	Textové editory	Bc. Pavol Briš
2.4	Existujúce programové systémy	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík
2.4.1	Blif2vhdl	Bc. Pavol Briš
2.4.2	BDS	Bc. Peter Jurík
2.4.3	BDS-PGA	Bc. Pavol Briš
2.4.4	MVSIS 2.0	Bc. Pavol Briš
2.4.5	Vzájomné porovnanie	Bc. Jozef Vicen
2.5	Existujúce návrhové framework-y	Všetci členovia tímu
2.5.1	Ptolemy II	Bc. Marián Bednár
2.5.2	Bluespec	Bc. Ján Janičkovič
2.5.3	Metropolis	Bc. Peter Jurík
2.5.4	ForSyDe	Bc. Pavol Briš
2.5.5	SML-sys	Bc. Jozef Vicen

2.6	Zhodnotenie analýzy	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen
3	Návrh	Bc. Ján Janičkovič Bc. Marián Bednár Bc. Peter Jurík
3.1	Špecifikácia požiadaviek	Bc. Peter Jurík
3.2	Hrubý návrh	Bc. Ján Janičkovič Bc. Marián Bednár
4	Použité zdroje	Bc. Jozef Vicen

3.2 Letný semester

1. Zhodnotenie činností a výsledkov v zimnom semestri
2. Dopracovanie zistených nedostatkov do dokumentácie
3. Vytvorenie plánu na letný semester, rozdelenie úloh a stanovenie dlhodobých činností
4. Tvorba podrobného návrhu vytváraného systému a začiatok implementácie
5. Vytvorenie plánu na overenie a otestovanie výsledku
6. Tvorba dokumentácie k projektu a dokumentácie riadenia projektu
7. Integrácia projektu a dokončenie implementácie
8. Dokončenie dokumentácie a dokumentácie riadenia
9. Odovzdanie produktu spolu s dokumentáciou
10. Tvorba prezentácie k obhajobe produktu
11. Vytvorenie posudku na iný tím
12. Odovzdanie plagátov k obhajobe
13. Prezentácia a obhajoba projektu

3.2.1 Úlohy členov tímu

3.2.1.1 Dlhodobé úlohy

- **Bc. Peter Jurík**
 - tvorba dokumentácie
 - tvorba dokumentácie riadenia
 - implementácia
 - vedúci tímu
- **Bc. Marián Bednár**
 - tvorba dokumentácie
 - práca na návrhu
 - správa web stránky
- **Bc. Pavol Briš**
 - tvorba dokumentácie
 - implementácia
 - testovanie produktu
- **Bc. Ján Janičkovič**
 - implementácia
 - riadenie implementácie
 - správa nástrojov pre riadenie projektu
- **Bc. Jozef Vicen**
 - tvorba dokumentácie
 - práca na návrhu
 - integrácia dokumentácie

3.2.1.2 Rozdelenie úloh tímu

Bc. Peter Jurík

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
10.2	Zhotoviť plán na letný semester.	1.5	11
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	45	11
10.8	Tvorba dokumentácie.	5	11
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	1	11
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	0	16
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	0	16
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov.	5	17
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	1	18
17.4	Testovanie systému.	1	20
17.5	Úpravy systému.	3	20

Bc. Marián Bednár

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	14	11
10.8	Tvorba dokumentácie.	12	11
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	3	12
13.1	Nájdenie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	6	15
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	4	16
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	10	11
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	2	16
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov.	1	17
17.2	Úprava dokumentácie riadenia	4	20
17.4	Testovanie systému.	1	20

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	1	11
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	5	11
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	50	12
12.4	Spojenie text. editora s jadrom systému.	20	13
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	2	16
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	5	16
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov.	1	17
17.4	Testovanie systému.	5	20
17.5	Úpravy systému.	10	20


Bc. Ján Janičkovič

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	3	11
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	18	11
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	6	11
12.1	Vyčistenie a upravenie kódu.	0.5	13
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	2	13
12.4	Spojenie text. editora s jadrom systému.	1	13
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	0	16
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	1	16
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov.	3	17
17.1	Doplnenie špecifikácie XML.	1	20
17.5	Úpravy systému.	0.5	20
17.4	Testovanie systému.	1	20

Bc. Jozef Vicen

ID	Úloha	Čas na vypracovanie v hodinách	Zo zápisnice č.
10.4	Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy.	1	11
10.8	Tvorba dokumentácie.	15	11
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	8	12
13.1	Nájdienie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	8	15
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	0	16
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	0.2	11
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	2	16
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov.	0.5	17
17.3	Úprava dokumentácie.	4	20
17.4	Testovanie systému.	1	20

3.2.1.3 Ganttov diagram s jednotlivými úlohami v tíme

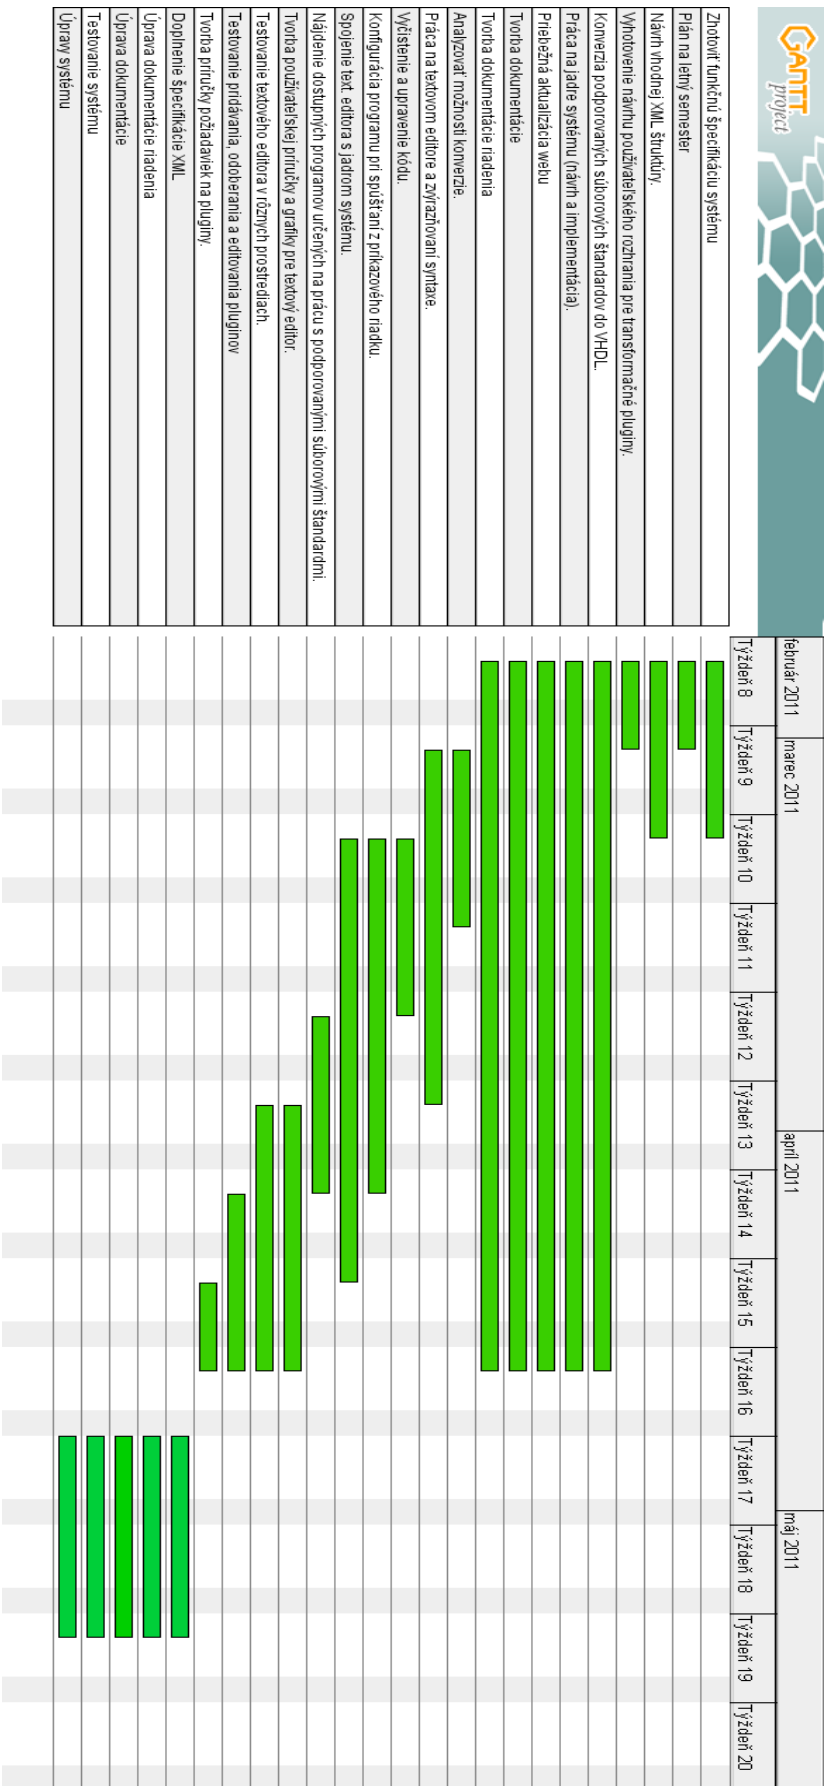

3.2.2 Autorstvo častí dokumentácie

Kapitola	Názov	Autor
4.1	Funkcionalita systému	Bc. Ján Janičkovič
4.2	Špecifikácia požiadaviek na pluginy	Bc. Peter Jurík
4.3	Integrácia pluginov	Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič
4.4	Implementácia pluginov	Bc. Peter Jurík
5	Testovanie	Bc. Jozef Vícen
6	Záver	Bc. Jozef Vícen
7	Použitá literatúra	Bc. Jozef Vícen
8	Používateľská príručka	Bc. Marian Bednár

4 Komunikácia v tíme

Táto kapitola popisuje zvolené spôsoby komunikácie medzi jednotlivými členmi tímu ako aj komunikácie mimo tímu.

4.1 Stretnutia tímu

Na začiatku zimného semestra sa stanovil čas a miesto na spoločné stretnutia. Termín bol stanovený na každý pondelok o 16:45. Počas tohto oficiálneho stretnutia sa kontroluje plnenie úloh a zadávajú sa nové úlohy. Na tomto stretnutí sa v rámci diskusie a dohody medzi jednotlivými členmi tímu a vedúcim tímu určuje smerovanie projektu. Z každého oficiálneho stretnutia sa spisuje zápisnica, ktorá je zverejnená na webovej stránke projektu a priložená k dokumentácii riadenia. Členovia tímu sa stretávajú aj neoficiálne a neformálne, vždy keď je potrebné ujasniť si úlohy a problémy v tíme.

4.2 Google groups

Na efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu bola založená skupina „Tímový projekt“ pomocou služby Google groups. V tejto skupine komunikujú členovia prostredníctvom e-mailových správ, ktoré sú rozposielané všetkým členom tímu tak, aby každý mal úplný prehľad o dianí v tíme.

Emailová adresa tímu - tp10@googlegroups.com

4.3 Webová stránka

Pre zabezpečenie komunikácie mimo tímu bola založená webová stránka, na ktorej sú informácie o tíme a jeho zložení, zadaní projektu, pláne projektu a o priebehu projektu. Z tejto stránky je možné stiahnuť jednotlivé zápisnice zo stretnutí, ponuku, ktorú vytvoril tím na začiatku semestra a iné dokumenty, ktoré súvisia s projektom.

Webová stránka projektu - <http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team10pss/>

4.4 Iná forma komunikácie

Členovia tímu využívajú na komunikáciu v prípade potreby mobilné telefóny, skype, icq a iné formy elektronickej komunikácie.

5 Zápisnice zo stretnutí

V tejto kapitole sú uvedené zápisnice z jednotlivých stretnutí.

5.1 Zápisnica 1

Téma stretnutia:

- Rozdelenie úloh v tíme, štúdium dokumentácie k projektom

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
4.10. 2010	17:00	Blok E 7. poschodie	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen	Ing. Matej Jurikovič	Bc. Ján Janičkovič

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Oboznámenie sa so zadáním
- Rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov tímu
- Štúdium materiálov tímových projektov z minulých rokov
 - zápisnice
 - dokumentácia k riadeniu
 - dokumentácia k projektu
- Založenie projektových denníkov

Priebeh stretnutia:

- Oboznámenie sa s pridelenou témou a úvodnými povinnosťami
- Prvotné rozdelenie úloh v tíme
 - Marián Bednár – vývoj a údržba web rozhrania projektu
 - Pavol Briš – programátor, tester aplikácie
 - Ján Janičkovič – zástupca vedúceho tímu, hlavný programátor
 - Peter Jurík – vedúci tímu, zodpovedný za dokumentáciu riadenia
 - Jozef Vicen – integrátor dokumentácie
- Štúdium obsahu a formy všetkých typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
1.1	Založenie projektového denníku.	Všetci členovia tímu	11.10.2010
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	Všetci členovia tímu	11.10.2010

5.2 Zápisnica 2

Téma stretnutia:

- Rozdelenie úloh v tíme, štúdium dokumentácie k projektom

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
11.10. 2010	16:45	Softvérové štúdio	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen	Bc. Peter Jurík	Bc. Ján Janičkovič

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Juríkovič

Ciele stretnutia:

- Oboznámenie sa so zadáním
- Získanie študijných materiálov
- Voľba a integrácia webového rozhrania projektu

Priebeh stretnutia:

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia
- Podrobná analýza zadania pridelenej témy
- Špecifikovanie cieľov pri analýze a návrhu systému
- Podanie stručných informácií o súborových systémoch, ktoré bude potrebné analyzovať
 - BDS (University of Massachusetts)
 - BLIF (University of California, Berkeley)
 - KISS
 - SLIF (Carnegie Mellon University)

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
1.1	Založenie projektového denníku.	Všetci členovia tímu	11.10.2010	
1.2	Štúdium typov dokumentácií týkajúcich sa tímového projektu.	Všetci členovia tímu	11.10.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
2.1	Analýza súborového systému BLIFF a vytvorenie webovej stránky.	Bc. Marián Bednár	18.10.2010
2.2	Analýza súborového systému SLIFF.	Bc. Pavol Briš	18.10.2010
2.3	Analýza softvérových nástrojov použitých pri riešení projektu.	Bc. Ján Janičkovič	18.10.2010
2.4	Analýza súborového systému KISS.	Bc. Jozef Vicen	18.10.2010
2.5	Analýza súborového systému BDS.	Bc. Peter Jurík	18.10.2010

5.3 Zápisnica 3

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie výsledkov analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov a rozdelenie ďalšej práce

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
18. 10. 2010	16:45	D 125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík		Bc. Peter Jurík

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy súborových systémov a softvérových nástrojov
- Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie analýzy súborových systémov
- Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
2.1	Analýza BLIFF, webová stránka.	Bc. Marián Bednár	18.10.2010	Analyzovať iné súborové systémy
2.2	Analýza SLIFF.	Bc. Pavol Briš	18.10.2010	Doplniť
2.3	Analýza softvérových nástrojov.	Bc. Ján Janičkovič	18.10.2010	
2.4	Analýza KISS.	Bc. Jozef Vicen	18.10.2010	Doplniť
2.5	Analýza BDS.	Bc. Peter Jurík	trvá	Rozpracované; Čakanie na materiály

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
3.1	Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné.	Bc. Marián Bednár	25.10.2010
3.2	Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové automaty a Petriho siete.	Bc. Pavol Briš	25.10.2010
3.3	Príprava softvérových nástrojov na správu projektu.	Bc. Ján Janičkovič	25.10.2010
3.4	Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné.	Bc. Jozef Vicen	25.10.2010
2.5	Analýza BDS a prípadná spolupráca na iných úlohách v tíme.	Bc. Peter Jurík	25.10.2010

5.4 Zápisnica 4

Téma stretnutia:

- Porovnanie a integrácia výsledkov analýzy súborových systémov a prezentovanie analýzy softvérových nástrojov, ktoré bude náš tím používať na komunikáciu, plánovanie, kontrolu plnenia plánu a prezentovanie grafických a textových editorov petriho sietí.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Nepřítomní členovia	zapisovateľ
25. 10. 2010	16:45	D 125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík		Bc. Pavol Briš

Pedagogický vedúci :

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy súborových systémov
- Prezentovať výsledky analýzy softvérových nástrojov
- Prezentovať výsledky analýzy grafických a textových editorov petriho sietí
- Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie analýzy súborových systémov
- Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov
- Vyhodnotenie analýzy grafických a textových editorov petriho sietí
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
3.1	Rozšíriť analýzu súborových systémov o PAL, príp. iné.	Bc. Marián Bednár	25.10.2010	Doplniť
3.2	Analýza grafických a textových editorov na konečné stavové automaty a Petriho siete.	Bc. Pavol Briš	25.10.2010	Doplniť
3.3	Príprava softvérových nástrojov na správu projektu.	Bc. Ján Janičkovič	25.10.2010	
3.4	Doplnenie analýzy KISS, príp. rozšírenie o iné.	Bc. Jozef Vicen	25.10.2010	
2.5	Analýza BDS a prípadná spolupráca na iných úlohách v tíme.	Bc. Peter Jurík	25.10.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
3.1	Analýza vývojových softvérových prostredí pre PAL, príp. iné.	Bc. Marián Bednár	4.11.2010
4.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF.	Bc. Pavol Briš	4.11.2010
4.3	Postupná integrácia analýzy súborových systémov.	Bc. Ján Janičkovič	4.11.2010
4.4	Analýza vývojových softvérových prostredí pre KISS, príp. rozšírenie o iné.	Bc. Jozef Vicen	4.11.2010
4.5	Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS.	Bc. Peter Jurík	4.11.2010

5.5 Zápisnica 5

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie analýzy softvérových systémov, ktoré používajú rôzne formáty súborov. Zhodnotenie analýzy ako celku a určenie ďalšej práce.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
4. 11. 2010	16:45	D 125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík	Bc. Jozef Vicen	Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS
- Prezentovať výsledky analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s BLIF, KISS, SLIF a PAL
- Prezentovať analýzu ako celok
- Na základe analýzy sa dohodnúť na ďalšom postupe

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre BDS
- Vyhodnotenie analýzy softvérových nástrojov pracujúcich s BLIF, KISS, SLIF a PAL
- Vyhodnotenie analýzy
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
3.1	Analýza vývojových softvérových prostredí pre PAL, príp. iné.	Bc. Marián Bednár	4.11.2010	
4.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre SLIF.	Bc. Pavol Briš	4.11.2010	
4.3	Postupná integrácia analýzy súborových systémov.	Bc. Ján Janičkovič	4.11.2010	
4.4	Analýza vývojových softvérových prostredí pre KISS príp. Rozšírenie o iné.	Bc. Jozef Vicen	4.11.2010	
4.5	Analýza vývojových softvérových prostredí pre BDS.	Bc. Peter Jurík	4.11.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
5.1	Návrh pridávania funkčných celkov(pluginov) do nášho systému. Doplniť web.	Bc. Marián Bednár	8.11.2010
5.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Pavol Briš	8.11.2010
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	Bc. Ján Janičkovič	8.11.2010
5.4	Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Jozef Vicen	8.11.2010
5.5	Špecifikácia požiadaviek na náš systém.	Bc. Peter Jurík	8.11.2010

5.6 Zápisnica 6

Téma stretnutia:

- Prezentovanie analýzy vývojových softvérových prostredí pre súborové štandardy. Zhodnotenie stavu analýzy a prezentácia hrubého návrhu riešenia. Upresnenie formy a obsahu dokumentácie projektu a určenie ďalšej práce.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Nepítomní členovia	zapisovateľ
8. 11. 2010	16:45	D 125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík		Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať výsledky analýzy vývojových softvérových prostredí.
- Prezentovať výsledky celkovej analýzy a jej formy.
- Prezentovať hrubý návrh riešenia projektu a špecifikáciu požiadaviek.
- Dohodnutie sa na konečnej forme a obsahu prvej časti dokumentácie a dokumentácie riadenia pred odovzdaním.

Priebeh stretnutia:

- Zhodnotenie špecifikácie požiadaviek na vytváraný systém.
- Zhodnotenie hrubého návrhu riešenia.
- Zhodnotenie výslednej analýzy.
- Vyhodnotenie výsledkov analýzy vývojových softvérových prostredí.
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
5.1	Návrh pridávania funkčných celkov (pluginov) do nášho systému. Doplniť web.	Bc. Marián Bednár	8.11.2010	
5.2	Analýza vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Pavol Briš	8.11.2010	
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	Úloha bude ďalej spracovávaná a dopĺňaná.
5.4	Úprava a formátovanie výsledného dokumentu analýzy a zjednotenie slohových štýlov. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Jozef Vicen	8.11.2010	
5.5	Špecifikácia požiadaviek na náš systém.	Bc. Peter Jurík	8.11.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
6.1	Doplniť web.	Bc. Marián Bednár	11.11.2010
6.2	Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty.	Bc. Pavol Briš	11.11.2010
6.3	Analýza editorov.	Bc. Ján Janičkovič	11.11.2010
6.4	Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Jozef Vicen	11.11.2010
6.5	Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia.	Bc. Peter Jurík	11.11.2010
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	Všetci členovia tímu	15.11.2010
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	Všetci členovia tímu	15.11.2010

5.7 Zápisnica 7

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie a poukázanie na jej nedostatky a chyby, ktorých sme sa dopustili. Dohoda o doplnení alebo zmene niektorých častí dokumentácie. Začiatok implementácie prototypu navrhovaného systému.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
15. 11. 2010	16:45	D 125	Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš	Bc. Peter Jurík

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Poukázať na chyby v dokumentácii a dokumentácii riadenia
- Navrhnuť zmeny v dokumentáciách
- Zhodnotiť vykonanie úloh z predhádzajúceho stretnutia
- Navrhnuť postup pri implementácii prototypu

Priebeh stretnutia:

- Poukázali sme na chyby v analýze. Najzávažnejšie chyby boli zle spracované odkazy na použité zdroje a nedostatočne podrobná analýza niektorých systémov
- Navrhli sme rozšírenie návrhu systému o diagramy prípadov použitia a sekvenčné diagramy
- Navrhli sme kto a ako bude postupovať pri implementácii prototypu systému
- Rozdelili sme vypracovanie posudkov na posudok k dokumentácii a posudok k dokumentácii riadenia

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
6.1	Doplniť web.	Bc. Marián Bednár	11.11.2010	
6.2	Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty.	Bc. Pavol Briš	11.11.2010	
6.3	Analýza editorov.	Bc. Ján Janičkovič	11.11.2010	
6.4	Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. Zhodnotenie analýzy.	Bc. Jozef Vicen	11.11.2010	
6.5	Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia.	Bc. Peter Jurík	11.11.2010	
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	Všetci členovia tímu	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
5.3	Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov.	Všetci členovia tímu	15.11.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
7.1	Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2.	Bc. Marián Bednár	22.11.2010
7.2	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia.	Bc. Marián Bednár	22.11.2010
7.3	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu.	Bc. Pavol Briš	22.11.2010
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	29.11.2010
7.5	Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy.	Bc. Ján Janičkovič	22.11.2010
7.6	Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2.	Bc. Jozef Vicen	22.11.2010
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	Všetci členovia tímu	22.11.2010
7.8	Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia.	Bc. Peter Jurík	22.11.2010

5.8 Zápisnica 8

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie vypracovaných posudkov.
- Zhodnotenie posudkov na vypracované posudky.
- Zhodnotenie a kontrola doplnených informácií do dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
22. 11. 2010	16:45	D 125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík		Bc. Pavol Briš

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať vypracované posudky.
- Prezentovať naše reakcie na posudky.
- Prezentovať doplnené informácie do dokumentácie
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie vypracovaných posudkov.
- Vyhodnotenie posudkov na vypracované posudky.
- Vyhodnotenie doplnených informácií do dokumentácie
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
7.1	Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2.	Bc. Marián Bednár	22.11.2010	
7.2	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia.	Bc. Marián Bednár	22.11.2010	
7.3	Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu.	Bc. Pavol Briš	22.11.2010	
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
7.5	Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy.	Bc. Ján Janičkovič	22.11.2010	
7.6	Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2.	Bc. Jozef Vicen	22.11.2010	
6.6	Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy.	Všetci členovia tímu	22.11.2010	
7.8	Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia.	Bc. Peter Jurík	22.11.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
8.1	Analýza programu Ptolemy 2.	Bc. Marián Bednár	6.12.2010
8.2	Analýza programu ForSyDe.	Bc. Pavol Briš	6.12.2010
8.3	Doplniť informácie o MVSIS.	Bc. Pavol Briš	6.12.2010
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	6.12.2010
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	6.12.2010
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	6.12.2010
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	6.12.2010
8.7	Analýza programu Metropolis.	Bc. Peter Jurík	6.12.2010

O každom napísať:

1. Načo sa daný systém používa?
2. Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?
3. Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?

5.9 Zápisnica 9

Téma stretnutia:

- Dosiahnutý progres analýzy ďalších súborových systémov.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
29. 11. 2010	16:45	D 125	Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík	Bc. Marián Bednár	Bc. Ján Janičkovič

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať nájdené zdroje a informácie.
- Prezentovať stav analýzy.

Priebeh stretnutia:

- Informovanie o stave analýzy ďalších súborových systémov
- Zdieľanie zdrojov informácií

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
8.1	Analýza programu Ptolemy 2.	Bc. Marián Bednár	trvá	
8.2	Analýza programu ForSyDe.	Bc. Pavol Briš	trvá	
8.3	Doplniť informácie o MVSIS.	Bc. Pavol Briš	trvá	
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	trvá	
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	trvá	
8.7	Analýza programu Metropolis.	Bc. Peter Jurík	trvá	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
8.1	Analýza programu Ptolemy 2.	Bc. Marián Bednár	6.12.2010
8.2	Analýza programu ForSyDe.	Bc. Pavol Briš	6.12.2010
8.3	Doplniť informácie o MVSIS.	Bc. Pavol Briš	6.12.2010
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	6.12.2010
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	6.12.2010
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	6.12.2010
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	6.12.2010
8.7	Analýza programu Metropolis.	Bc. Peter Jurík	6.12.2010

O každom napísať:

4. Načo sa daný systém používa?
5. Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?
6. Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?

5.10 Zápisnica 10

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.
- Zhodnotenie a kontrola doplnených informácií do dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
6. 12. 2010	16:45	D125	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať vypracované analýzy jednotlivých systémov.
- Reakcie na dané systémy.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

- Prezentovanie a vyhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.
- Diskusia o jednotlivých systémoch .
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
8.1	Analýza programu Ptolemy 2.	Bc. Marián Bednár	6. 12. 2010	
8.2	Analýza programu ForSyDe.	Bc. Pavol Briš	6. 12. 2010	
8.3	Doplniť informácie o MVSIS.	Bc. Pavol Briš	6. 12. 2010	
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	trvá	Dokončiť do nasledujúceho stretnutia
8.7	Analýza programu Metropolis.	Bc. Peter Jurík	6. 12. 2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
9.1	Doplnenie návrhu systému.	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš	13.12.2010
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010
9.2	Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	13.12.2010
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	13.12.2010
9.3	Doplniť dokumentáciu riadenia.	Bc. Peter Jurík	13.12.2010

5.11 Zázpisnica 11

Téma stretnutia:

- Sumarizácia dosiahnutých výsledkov práce na projekte v zimnom semestri
- Načrtnutie zámerov pri vývoji výsledného systému.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Nepítomní členovia	zapisovateľ
23.2. 2011	18:00	D124	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Sumarizácia práce v zimnom semestri.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o výsledkoch tímového projektu zo zimného semestra (dokumentácia a prototyp).
- Návrh a rozdelenie ďalšej práce.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
9.1	Doplnenie návrhu systému.	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš	13.12.2010	
7.4	Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010	
8.4	Analýza programu BlueSpec.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010	
9.2	Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému.	Bc. Ján Janičkovič	13.12.2010	
8.5	Analýza programu SML-SYS.	Bc. Jozef Vicen	13.12.2010	
8.6	Úprava a formátovanie dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	13.12.2010	
9.3	Doplniť dokumentáciu riadenia.	Bc. Peter Jurík	13.12.2010	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.2	Zhotoviť plán na letný semester.	Bc. Peter Jurík	2.3.2011
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.4	Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy.	Bc. Jozef Vicen	2.3.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia	Bc. Peter Jurík	20.4.2011

5.12 Zápisnica 12

Téma stretnutia:

- Reprezentácia pluginov v systéme a ich správa. Voľba typu úložiska pre informácie o pluginoch. Návrh spôsobu akým bude používateľské rozhranie prezentovať možnosti pluginu pri jeho používaní ale aj pri jeho pridávaní do systému.
- Možnosti transformácie jednotlivých súborových štandardov na iné štandardy. Návrh ako zobrazovať údaje načítané zo súborov.
- Plán práce na projekte v letnom semestri, dlhodobé úlohy a formálna stránka dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
2.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen	Bc. Marián Bednár	Bc. Peter Jurík

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť prostriedky a spôsob pri implementácii systému a konkrétne pri správe pluginov.
- Navrhnuť niektoré prvky používateľského rozhrania.
- Zdokonaľiť spôsob tvorby dokumentácie (dokumentácia, riadenie projektu a zápisnice).

Priebeh stretnutia:

- Kontrola plnenia jednotlivých úloh z predchádzajúceho stretnutia a upozornenie na nedostatky pri plnení týchto úloh.
- Diskusia o implementácii správy pluginov t.j. spôsob uloženia informácií o plugine a spôsob prezentácie funkcionality pluginu používateľovi.
- Diskusia o transformáciách medzi súborovými štandardmi, možnosti ich zobrazenia, upravovania a prípadné zvýraznenie syntaxe.
- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	9.3.2011
10.2	Zhotoviť plán na letný semester.	Bc. Peter Jurík	2.3.2011	
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	9.3.2011
10.4	Vyhotovenie návrhu používateľského rozhrania pre transformačné pluginy.	Bc. Jozef Vicen	2.3.2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu	Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia	Bc. Peter Jurík	Dlhodobá úloha	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Peter Jurík	20.4.2011
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	9.3.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvyrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	9.3.2011

5.13 Zápisnica 13

Téma stretnutia:

- Predvedenie textového editora a XML štruktúra reprezentácia pluginov.
- Skoordinovať postup programátorov v implementácii jadra systému a samotných pluginov.
- Pozmeniť dlhodobé práce jednotlivých členov tímu.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
9.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Zosúladiť postup programátorov pri vývoji jadra a pluginov systému.
- Prezentovať textový editor systému a diskusia k nemu.
- Znovu prerozdelenie niektorých úloh.
- Pozmeniť spôsob tvorby dokumentácie (dokumentácia, riadenie projektu a zápisnice).

Priebeh stretnutia:

- Diskusia k textovému editoru systému a dohodnutie ďalších možnosti funkcionality editora.
- Predvedenie textového editora.
- Zhodnotenie a diskusia k XML štruktúre reprezentácie pluginov. Načítavanie, mapovanie a ukladanie do XML z časti hotové.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii editora a jadra systému. Koordinovanie programátorov pri implementácii a diskusia ohľadne depozitáru.
- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.1	Zhotoviť funkčnú špecifikáciu systému.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011	
10.3	Návrh vhodnej XML štruktúry reprezentácie pluginov.	Bc. Ján Janičkovič	9.3.2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	23.3.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Peter Jurík	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	trvá	16.3.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	23.3.2011
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	23.3.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Marián Bednár Bc. Jozef Vicen	20.4.2011
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	16.3.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	20.4.2011
12.1	Výčistenie a upravenie kódu.	Bc. Ján Janičkovič	16.3.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
12.4	Spojenie text. editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011

5.14 Zázpisnica 14

Téma stretnutia:

- Nové funkcie textového editora a postup pri ďalšom vývoji jadra systému.
- Progres v zosúladení implementácie jadra systému a textového editora.
- Transformácie jednotlivých súborových štandardov na štandard VHDL.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
16.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Bc. Ján Janičkovič	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri vývoji jadra a pluginov systému.
- Prezentovať textový editor pre súborové štandardy a diskusia o jeho transformačných schopnostiach.

Priebeh stretnutia:

- Predvedenie a diskusia k novým funkciám textového editora.
- Uzavretie diskusie o transformáciách medzi jednotlivými súborovými štandardmi.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii editora a jadra systému.
- Diskusia k obsahovej forme implementačnej časti projektovej dokumentácie.
- Stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	Zmena termínu na 20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.1	Analyzovať možnosti konverzie medzi jednotlivými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	16.3.2011	
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011
12.1	Vyčistenie a upravenie kódu.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	23.3.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	Zmena na 20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	20.4.2011
12.1	Vyčistenie a upravenie kódu.	Bc. Ján Janičkovič	23.3.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011

5.15 Zápisnica 15

Téma stretnutia:

- Progres v implementácii jadra.
- Progres v zosúladení implementácie jadra systému a textového editora.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
23.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri vývoji jadra a následným spojením s textovým editorom. Postup pri tvorbe interfacu.
- Navrhnuť ako implementovať spúšťanie systému cez príkazový radok.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o dosiahnutom prograse pri implementácii jadra systému.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora, pluginov a jadra systému.
- Diskusia k používaniu systému cez príkazový riadok.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	Zmena termínu na 20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011
12.1	Vyčistenie a upravenie kódu.	Bc. Ján Janičkovič	23.3.2011	
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	6.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	20.4.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	6.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011
13.1	Nájdenie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011

5.16 Zázpisnica 16

Téma stretnutia:

- Progres v implementácii jadra.
- Progres v práci na textovom editore systému.
- Progres v zosúladiení implementácie jadra systému a textového editora.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
30.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Bc. Ján Janičkovič	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri vývoji jadra a následné spojenie s textovým editorom.
- Navrhnuť spôsob testovania editora a upresniť posledné potrebné kroky pri jeho ukončovaní.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o dosiahnutom prograse pri implementácii jadra systému.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora, pluginov a jadra systému.
- Diskusia k spôsobu testovania vytvoreného textového editora.
- Diskusia k tvorbe dokumentácie a používateľskej príručky.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	30.3.2011	
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011
13.1	Nájdienie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011
13.1	Nájdienie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011

5.17 Zápisnica 17

Téma stretnutia:

- Progres v implementácii jadra a prepojenie s textovým editorom.
- Progres tvorbe pluginu podporovaných štandardov do VHDL.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
6.4. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár Bc. Ján Janičkovič		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri spojení systému do jedného celku.
- Navrhnuť spôsob testovania jadra cez konzolu.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o funkčnosti jadra systému. Dohodnutie testovania jadra.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora, pluginov a jadra systému.
- Diskusia ku GUI na obsluhu jadra.
- Diskusia k tvorbe dokumentácie a používateľskej príručky.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011
13.1	Nájdenie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	6.4.2011	
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4.2011

5.18 Zázpisnica 18

Téma stretnutia:

- Progres v implementácii systému.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
13.4. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár Bc. Ján Janičkovič	Bc. Pavol Briš	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Navrhnuť postup programátorov pri ukončovaní tvorby systému.
- Navrhnuť spôsob testovania systému.
- Rozhodnúť o všetkých potrebných častiach dokumentácie.
- Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o progrese pri implementácii jadra systému, o funkčnosti jeho prvej beta verzie a o jej testovaní.
- Diskusia k tvorbe a odovzdaniu dokumentácie a používateľskej príručky.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp. predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011	
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4.2011
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	20.4.2011

5.19 Zázpisnica 19

Téma stretnutia:

- Prezentácia systému.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
18.4. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš	Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prediskutovať záverečné detaily ohľadne implementácie
- Prezentovať systém.

Priebeh stretnutia:

- Diskusia o progrese pri implementácii jadra systému, o funkčnosti jeho prvej beta verzie a o jej testovaní.
- Prezentácia systému.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp. predĺženie termínov už existujúcich úloh.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	trvá	20.4.2011
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	trvá	20.4.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	05/11/11
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4.2011
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.	všetci členovia tímu	20.4.2011
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4.2011
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4.2011
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	20.4.2011

5.20 Zázpisnica 20

Téma stretnutia:

- Určiť nové úlohy
- Diskusia k výstupu tímového projektu ku kontrolnému bodu 20.4.2011

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
25.4. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen		Bc. Marián Bednár

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prediskutovať úpravy systému a odstraňovanie chýb projekte.
- Prerozdeliť nové úlohy

Priebeh stretnutia:

- Ukončenie všetkých úloh k dňu 20.4.2011 a prerozdelenie nových.
- Diskusia k nedostatkom systému.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4. 2011	
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4. 2011	
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4. 2011	
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	20.4. 2011	
14.1	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
14.2	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
15.1	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov	všetci členovia tímu	20.4. 2011	
16.1	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.	Bc. Peter Jurík	20.4. 2011	

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.1	Doplnenie špecifikácie XML	Bc. Ján Janičkovič	9.5.2011
17.2	Úprava dokumentácie riadenia	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.3	Úprava dokumentácie	Bc. Jozef Vicen	11.5.2011
17.4	Testovanie systému	všetci členovia tímu	11.5.2011
17.5	Úpravy systému	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič	11.5.2011

5.21 Zázpisnica 21

Téma stretnutia:

- Určenie posledných úloh a ukončenie projektu.
- Výstup tímového projektu.
- Posledné úpravy dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
2.5. 2011	18:00	D124	Ing. Matej Jurikovič Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen	Bc. Peter Jurík Bc. Marián Bednár	Bc. Jozef Vicen

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Diskusia k finálnej verzii programovej časti projektu.
- Diskusia k finálnej verzii dokumentácie.
- Rozdelenie posledných úloh.

Priebeh stretnutia:

- Predvedenie poslednej vylepšenej verzie programového systému.
- Diskusia k ukončeniu posledných prác na projekte a k jeho odovzdaniu.

Kontrola plnenia úloh:

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
17.1	Doplnenie špecifikácie XML.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	9.5.2011
17.2	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
17.3	Úprava dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	trvá	11.5.2011
17.4	Testovanie systému.	všetci členovia tímu	trvá	11.5.2011
17.5	Úpravy systému.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič	trvá	11.5.2011

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.1	Doplnenie špecifikácie XML.	Bc. Ján Janičkovič	9.5.2011
17.2	Úprava dokumentácie riadenia.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
17.3	Úprava dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen	11.5.2011
17.4	Testovanie systému.	všetci členovia tímu	11.5.2011
17.5	Úpravy systému.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík Bc. Ján Janičkovič	11.5.2011

6 Preberacie protokoly

V tejto kapitole sú uvedené vzory preberacích protokolov, ktoré slúžia ako potvrdenie o prevzatí dokumentácie vedúcim projektu a posudzujúcim tímom.

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o tíme

Názov Projektu	Prostredie pre návrh digitálnych systémov
Tím	Tím č. 10
Autori	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík
Kontakt	tp10@googlegroups.com

Informácie o odovzdávanej dokumentácii:

Dátum odovzdania	Názov dokumentu	Počet strán	Prevzal tím

Zástupca odovzdávajúceho tímu:

Meno a priezvisko	Podpis

Zástupca preberacieho tímu:

Meno a priezvisko	Podpis

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentácie uvedenej v časti „Informácie o odovzdávanej dokumentácii“.

V Bratislave dňa:

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o tíme

Názov Projektu	Prostredie pre návrh digitálnych systémov
Tím	Tím č. 10
Autori	Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík
Kontakt	tp10@googlegroups.com

Informácie o odovzdávanej dokumentácii:

Dátum odovzdania	Názov dokumentu	Počet strán

Zástupca odovzdávajúceho tímu:

Meno a priezvisko	Podpis

Vedúci tímu:

Meno a priezvisko	Podpis
Ing. Matej Jurikovič	

Svojim podpisom potvrdzujem prebratie dokumentácie uvedenej v časti „Informácie o odovzdávanej dokumentácii“.

V Bratislave dňa:
