





ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names	27 Sep '10							4 Oct '10				
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	
1	<b>Projekt Tréner mentálnych schopností</b>	<b>70 days?</b>	<b>Mon 27.9.10</b>	<b>Fri 17.12.10</b>														
2	<b>Pred analýzou</b>	<b>6 days?</b>	<b>Mon 27.9.10</b>	<b>Sat 2.10.10</b>														
7	<b>Analýza</b>	<b>14 days?</b>	<b>Mon 4.10.10</b>	<b>Tue 19.10.10 2</b>														
25	<b>Návrh</b>	<b>10 days?</b>	<b>Wed 20.10.10</b>	<b>Sat 30.10.10 7</b>														
39	<b>Finalizácia dokumentov</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 1.11.10</b>	<b>Wed 3.11.10 32</b>														
43	<b>Implementácia prototypu</b>	<b>30 days?</b>	<b>Thu 4.11.10</b>	<b>Wed 8.12.10 25</b>														
44	<b>Inštalácia a konfigurácia vývojového prostredia</b>	<b>1 day?</b>	<b>Thu 4.11.10</b>	<b>Thu 4.11.10 42</b>														
45	Eclipse pre PHP a Flex	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		AL												
46	Web server XAMPP a MySQL server	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		MB												
47	<b>Inštalácia a konfigurácia podporných prostriedkov</b>	<b>1 day?</b>	<b>Thu 4.11.10</b>	<b>Thu 4.11.10 42</b>														
48	Konfigurácia SVN	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		OU												
49	Vytvorenie vývojových prostredí	2 days	Fri 5.11.10	Sat 6.11.10 44;47		MB;GD;PB;OU;AL;RS												
50	Kostra aplikácie a jadrové API - inštalácia frameworku	3 days	Mon 8.11.10	Wed 10.11.10 49		MB;RS												
51	Testovanie jadrového API	2 days	Thu 11.11.10	Fri 12.11.10 50														
52	<b>Prototyp API aplikačného backendu</b>	<b>6 days</b>	<b>Thu 11.11.10</b>	<b>Wed 17.11.10 50</b>														
53	Komunikácia Flexu s PHP	2 days	Thu 11.11.10	Fri 12.11.10		AL												
54	Implementácia WebServiceu	4 days	Sat 13.11.10	Wed 17.11.10 53		AL												
55	Bezpečnostný aspekt - práva a role	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		RS												
56	Návrh a implementácia kontrollerov	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		MB;OU												
57	Testovanie aplikačného API	3 days	Thu 18.11.10	Sat 20.11.10 52		MB;PB												
58	<b>Prototyp API databázového backendu</b>	<b>6 days</b>	<b>Thu 11.11.10</b>	<b>Wed 17.11.10 50</b>														
59	Databázový backend	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		MB;AL												
60	Vytvorenie databázovej štruktúry	3 days	Thu 11.11.10	Sat 13.11.10		GD												
61	<b>Testovanie databázového API</b>	<b>3 days?</b>	<b>Thu 18.11.10</b>	<b>Sat 20.11.10 59</b>														
62	Vloženie vzorových údajov	1 day?	Thu 18.11.10	Thu 18.11.10		GD												
63	Testovanie	2 days	Fri 19.11.10	Sat 20.11.10 62		AL												
64	Prototyp API pre správu rozšírení	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10 50		MB												
65	Testovanie API pre správu rozšírení	3 days	Thu 18.11.10	Sat 20.11.10 64		PB												
66	Protoyp používateľského rozhrania	6 days	Thu 18.11.10	Wed 24.11.10 52;58;66		PB;AL												
67	Testovanie používateľského rozhrania	3 days	Thu 25.11.10	Sat 27.11.10 66														
68	Implementácia vzorových hier	6 days	Thu 18.11.10	Wed 24.11.10 52;58;66		MB;GD;PB;OU;AL;RS												
69	Testovanie hier	3 days	Thu 25.11.10	Sat 27.11.10 68		MB;GD;PB;OU;AL;RS												


Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names														
							27 Sep '10							4 Oct '10						
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T			
70	<b>Zpracovanie pripomienok</b>	<b>12 days</b>	<b>Thu 25.11.10</b>	<b>Wed 8.12.10</b>	<b>68</b>															
71	Dokončenie hier	8 days	Thu 25.11.10	Fri 3.12.10		MB;GD;PB;OU;AL;RS														
72	Zmena výzoru hier	4 days	Sat 4.12.10	Wed 8.12.10	71	MB;GD;PB;OU;AL;RS														
73	Zmena výzoru portálu	4 days	Sat 4.12.10	Wed 8.12.10		PB														
74	<b>Testovanie aplikácie</b>	<b>5 days</b>	<b>Thu 9.12.10</b>	<b>Wed 15.12.10</b>	<b>43</b>															
75	Testovanie aplikácie	3 days	Thu 9.12.10	Mon 13.12.10	70	MB;GD;PB;OU;AL;RS														
76	Oprava chýb	2 days	Tue 14.12.10	Wed 15.12.10	75	PB;GD;AL;MB														
77	<b>Nefunkcionálne požiadavky</b>	<b>68 days?</b>	<b>Wed 29.9.10</b>	<b>Fri 17.12.10</b>																

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

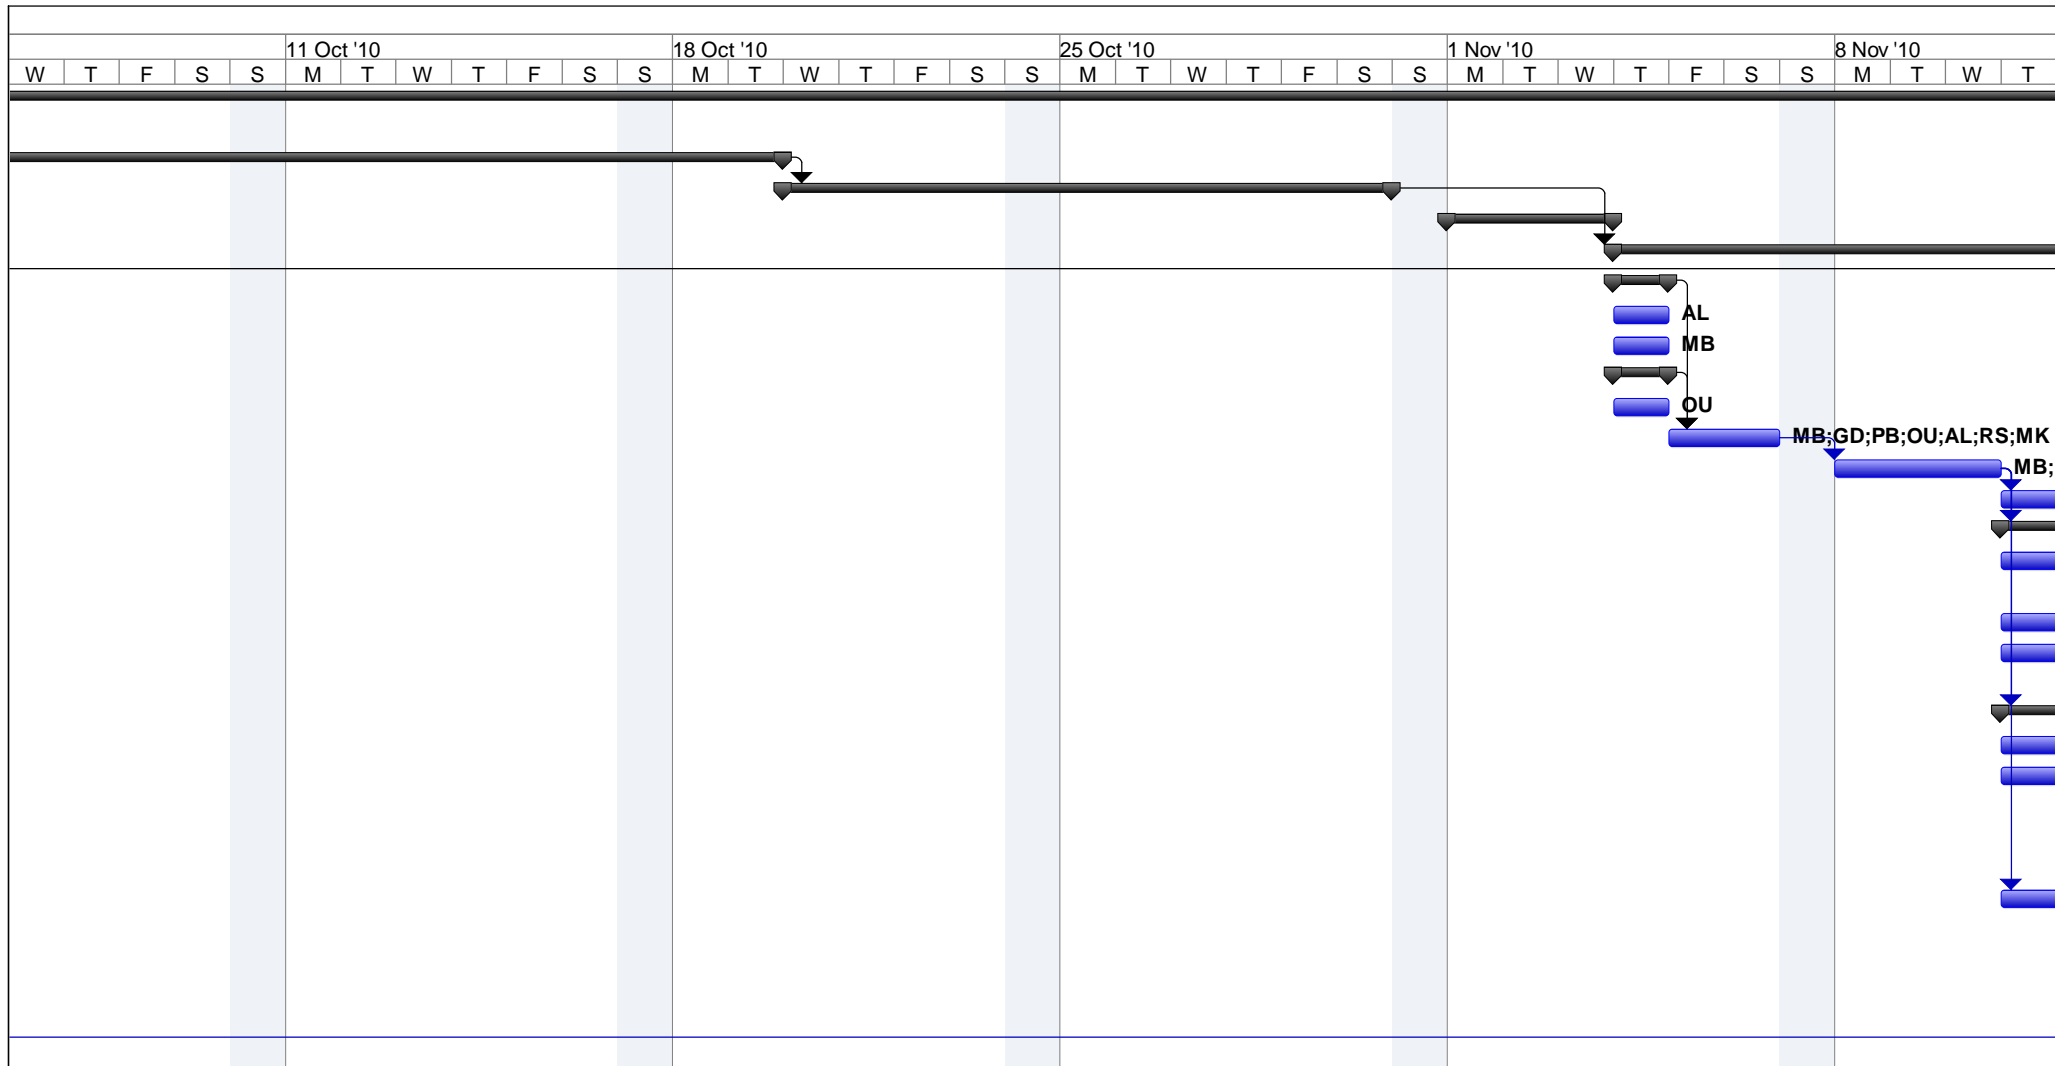

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
 Date: Sun 12.12.10


Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

					11 Oct '10					18 Oct '10					25 Oct '10					1 Nov '10					8 Nov '10											
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T




Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

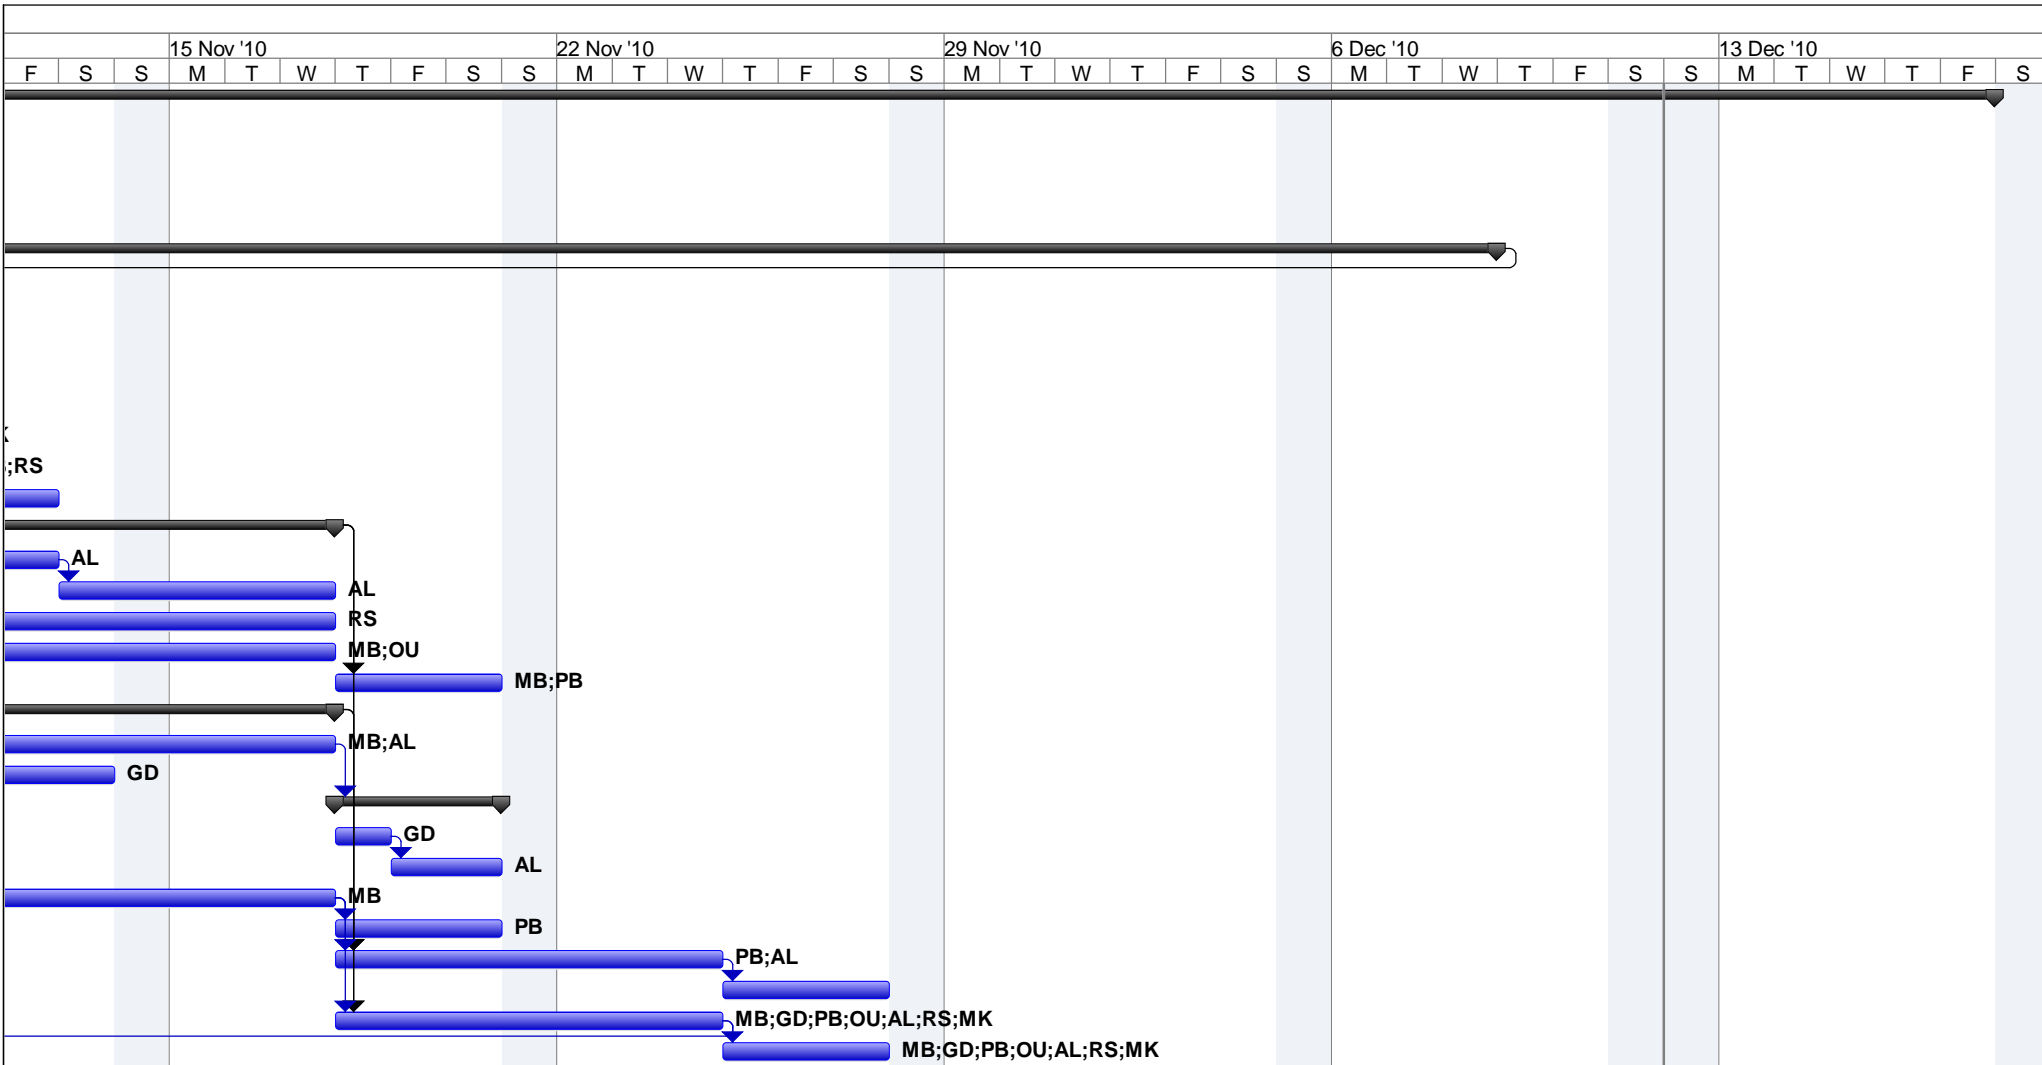

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

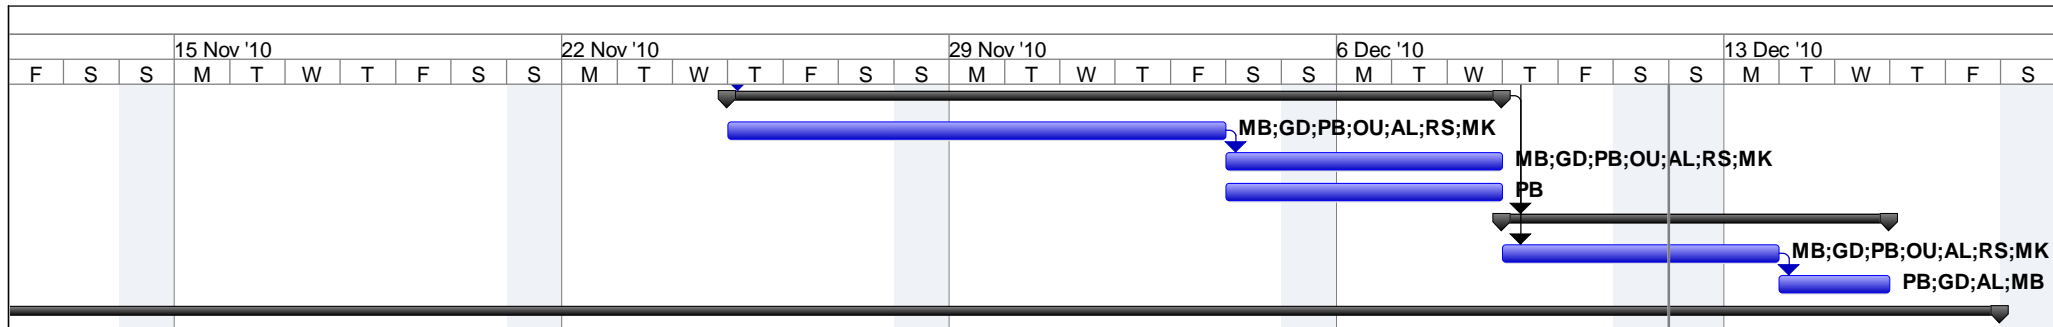

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny  
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	
