










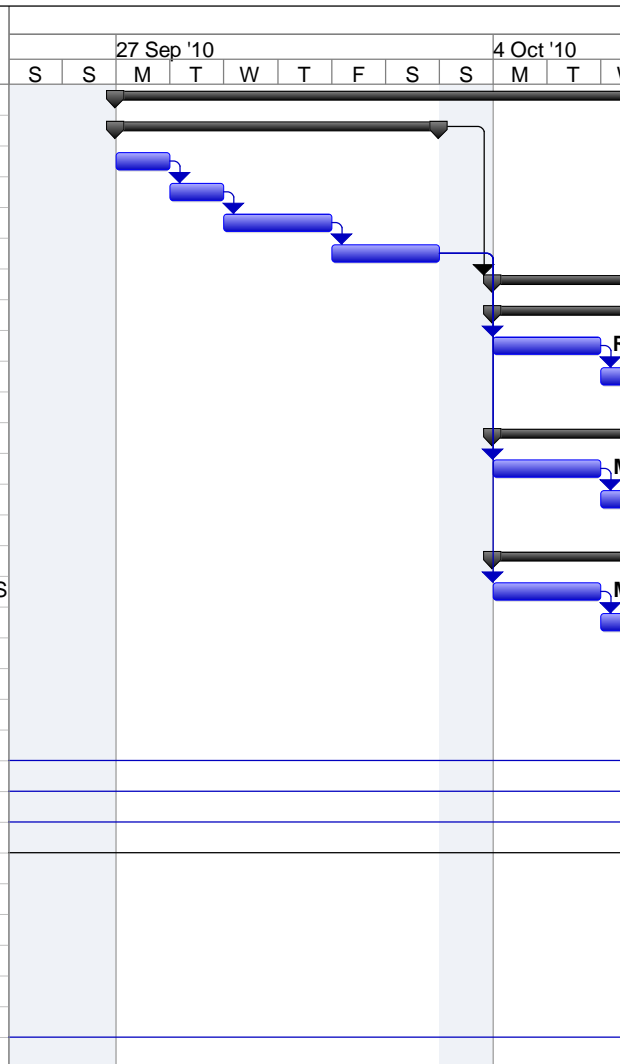









ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names	27 Sep '10							4 Oct '10							
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W			
1	Projekt Tréner mentálnych schopností	70 days?	Mon 27.9.10	Fri 17.12.10																	
2	Pred analýzou	6 days?	Mon 27.9.10	Sat 2.10.10																	
3	Inicializácia projektu	1 day?	Mon 27.9.10	Mon 27.9.10																	
4	Zadefinovanie úloh v tíme	1 day?	Tue 28.9.10	Tue 28.9.10	3																
5	Zvolenie metódy vývoja	2 days?	Wed 29.9.10	Thu 30.9.10	4																
6	Motivácia na riešenie problematickej oblasti	2 days?	Fri 1.10.10	Sat 2.10.10	5																
7	Analýza	14 days?	Mon 4.10.10	Tue 19.10.10	2																
8	Analýza problematickej oblasti	8 days?	Mon 4.10.10	Tue 12.10.10																	
9	Štúdium problematickej oblasti	2 days?	Mon 4.10.10	Tue 5.10.10	6	RS															
10	Finalizácia problematická oblasť	4 days?	Wed 6.10.10	Sat 9.10.10	9	RS															
11	Schválenie a pripomienkovanie analýzy	2 days?	Mon 11.10.10	Tue 12.10.10	10	MK															
12	Analýza existujúcich riešení	8 days?	Mon 4.10.10	Tue 12.10.10																	
13	Analýza existujúcich riešení	2 days?	Mon 4.10.10	Tue 5.10.10	6	MB;GD;PB;OU;AL															
14	Finalizácia analýzy existujúcich riešení	4 days?	Wed 6.10.10	Sat 9.10.10	13	OU															
15	Schválenie a pripomienkovanie analýzy	2 days?	Mon 11.10.10	Tue 12.10.10	14	MK															
16	Analýza požiadaviek	8 days?	Mon 4.10.10	Tue 12.10.10																	
17	Formulovanie požiadaviek	2 days?	Mon 4.10.10	Tue 5.10.10	6	MB;GD;PB;OU;AL;RS															
18	Finalizácia požiadaviek	4 days?	Wed 6.10.10	Sat 9.10.10	17	PB															
19	Schválenie a pripomienkovanie požiadaviek	2 days?	Mon 11.10.10	Tue 12.10.10	18	MK															
20	Analýza technológií	8 days?	Mon 11.10.10	Tue 19.10.10																	
21	Analýza platformy	2 days?	Mon 11.10.10	Tue 12.10.10	18	GD															
22	Analýza technológií - architektúra	6 days?	Wed 13.10.10	Tue 19.10.10	21	MB;AL															
23	Analýza technológií - splnenie požiadaviek	6 days?	Wed 13.10.10	Tue 19.10.10	21	GD															
24	Analýza technológií - gui	2 days?	Mon 18.10.10	Tue 19.10.10		PB															
25	Návrh	10 days?	Wed 20.10.10	Sat 30.10.10	7																
26	Funkcionálny návrh	10 days?	Wed 20.10.10	Sat 30.10.10																	
27	Návrh funkcionality, UML prípady použitia	3 days	Wed 20.10.10	Fri 22.10.10	11;15;	OU															
28	Návrh grafického rozhrania	4 days	Sat 23.10.10	Wed 27.10.10	27	PB;GD															
29	Návrh štruktúry hier	4 days	Sat 23.10.10	Wed 27.10.10	27	PB;GD															
30	Finalizácia návrhu funkcionality	3 days?	Mon 25.10.10	Wed 27.10.10		OU															
31	Schválenie a pripomienkovanie návrhu funkcionality	3 days	Thu 28.10.10	Sat 30.10.10	30	MK															
32	Architektonický návrh	10 days?	Wed 20.10.10	Sat 30.10.10																	



Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10


Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Preced	Resource Names	27 Sep '10							4 Oct '10					
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	V	
33	Výber technológií pre implementáciu	0,71 days?	Wed 20.10.10	Wed 20.10.10	22;23;	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
34	Návrh logickej architektúry, UML diagramy	6 days	Wed 20.10.10	Wed 27.10.10	33	OU;MB;AL													
35	Hrubý návrh fyzickej architektúry, UML diagramy	3 days	Wed 27.10.10	Sat 30.10.10	34	MB;AL													
36	Návrh databázy, UML modely	3 days	Wed 27.10.10	Sat 30.10.10	34	RS													
37	Finalizácia návrhu	3 days?	Mon 25.10.10	Wed 27.10.10		OU													
38	Schválenie a pripomienkovanie architektonického návrhu	3 days	Thu 28.10.10	Sat 30.10.10	37	MK													
39	Finalizácia dokumentov	3 days	Mon 1.11.10	Wed 3.11.10	32														
40	Finalizácia dokumentácie k analýze a návrhu	2 days	Mon 1.11.10	Tue 2.11.10	31	RS;OU													
41	Finalizácia dokumentácie k riadeniu	2 days	Mon 1.11.10	Tue 2.11.10		RS;OU													
42	Schválenie a pripomienkovanie odovzdaných dokumentov	3 days	Mon 1.11.10	Wed 3.11.10		MK													
43	Implementácia prototypu	30 days?	Thu 4.11.10	Wed 8.12.10	25														
44	Inštalácia a konfigurácia vývojového prostredia	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10	42														
45	Eclipse pre PHP a Flex	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		AL													
46	Web server XAMPP a MySQL server	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		MB													
47	Inštalácia a konfigurácia podporných prostriedkov	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10	42														
48	Konfigurácia SVN	1 day?	Thu 4.11.10	Thu 4.11.10		OU													
49	Vytvorenie vývojových prostredí	2 days	Fri 5.11.10	Sat 6.11.10	44;47	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
50	Kostra aplikácie a jadrové API - inštalácia frameworku	3 days	Mon 8.11.10	Wed 10.11.10	49	MB;RS													
51	Testovanie jadrového API	2 days	Thu 11.11.10	Fri 12.11.10	50														
52	Prototyp API aplikačného backendu	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10	50														
53	Komunikácia Flexu s PHP	2 days	Thu 11.11.10	Fri 12.11.10		AL													
54	Implementácia WebServicu	4 days	Sat 13.11.10	Wed 17.11.10	53	AL													
55	Bezpečnostný aspekt - práva a role	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		RS													
56	Návrh a implementácia kontrollerov	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		MB;OU													
57	Testovanie aplikačného API	3 days	Thu 18.11.10	Sat 20.11.10	52	MB;PB													
58	Prototyp API databázového backendu	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10	50														
59	Databázový backend	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10		MB;AL													
60	Vytvorenie databázovej štruktúry	3 days	Thu 11.11.10	Sat 13.11.10		GD													
61	Testovanie databázového API	3 days?	Thu 18.11.10	Sat 20.11.10	59														
62	Vloženie vzorových údajov	1 day?	Thu 18.11.10	Thu 18.11.10		GD													
63	Testovanie	2 days	Fri 19.11.10	Sat 20.11.10	62	AL													
64	Prototyp API pre správu rozšírení	6 days	Thu 11.11.10	Wed 17.11.10	50	MB													

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10


Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names	27 Sep '10							4 Oct '10					
							S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	V	
65	Testovanie API pre správu rozšírení	3 days	Thu 18.11.10	Sat 20.11.10	64	PB													
66	Protoyp používateľského rozhrania	6 days	Thu 18.11.10	Wed 24.11.10	52;58;	PB;AL													
67	Testovanie používateľského rozhrania	3 days	Thu 25.11.10	Sat 27.11.10	66														
68	Implementácia vzorových hier	6 days	Thu 18.11.10	Wed 24.11.10	52;58;	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
69	Testovanie hier	3 days	Thu 25.11.10	Sat 27.11.10	68	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
70	Zpracovanie pripomienok	12 days	Thu 25.11.10	Wed 8.12.10	68														
71	Dokončenie hier	8 days	Thu 25.11.10	Fri 3.12.10		MB;GD;PB;OU;AL;RS													
72	Zmena výzoru hier	4 days	Sat 4.12.10	Wed 8.12.10	71	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
73	Zmena výzoru portálu	4 days	Sat 4.12.10	Wed 8.12.10		PB													
74	Testovanie aplikácie	5 days	Thu 9.12.10	Wed 15.12.10	43														
75	Testovanie aplikácie	3 days	Thu 9.12.10	Mon 13.12.10	70	MB;GD;PB;OU;AL;RS													
76	Oprava chýb	2 days	Tue 14.12.10	Wed 15.12.10	75	PB;GD;AL;MB													
77	Nefunkcionálne požiadavky	68 days?	Wed 29.9.10	Fri 17.12.10															
78	Vytvorenie plagátu tímu	1 day?	Mon 4.10.10	Mon 4.10.10		PB													
79	Web prezentácia	6 days?	Wed 6.10.10	Tue 12.10.10		MB													
80	Štábná kultúra	6 days?	Wed 6.10.10	Tue 12.10.10		OU													
81	Vypracovanie zápisu z 1. stretnutia	4 days?	Wed 29.9.10	Sat 2.10.10		OU													
82	Vypracovanie zápisu z 2. stretnutia	4 days?	Wed 6.10.10	Sat 9.10.10		OU													
83	Vypracovanie zápisu z 3. stretnutia	4 days?	Wed 13.10.10	Sat 16.10.10		RS													
84	Vypracovanie zápisu z 4. stretnutia	4 days?	Wed 20.10.10	Sat 23.10.10		RS													
85	Vypracovanie zápisu z 5. stretnutia	4 days?	Wed 27.10.10	Sat 30.10.10		MB													
86	Vypracovanie zápisu z 6. stretnutia	4 days?	Wed 3.11.10	Sat 6.11.10		MB													
87	Vypracovanie zápisu z 7. stretnutia	4 days?	Wed 10.11.10	Sat 13.11.10		PB													
88	Vypracovanie zápisu z 8. stretnutia	4 days?	Wed 17.11.10	Sat 20.11.10		PB													
89	Vypracovanie zápisu z 9. stretnutia	4 days?	Wed 24.11.10	Sat 27.11.10		GD													
90	Vypracovanie zápisu z 10. stretnutia	4 days?	Wed 1.12.10	Sat 4.12.10		GD													
91	Vypracovanie zápisu z 11. stretnutia	4 days	Wed 8.12.10	Mon 13.12.10		AL													
92	Príprava prezentácie prototypu	0,14 days?	Wed 15.12.10	Wed 15.12.10		MB;GD;PB;OU;AL;RS													
93	Ukončenie prác prvého semestra	1 day?	Fri 17.12.10	Fri 17.12.10		RS													




Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

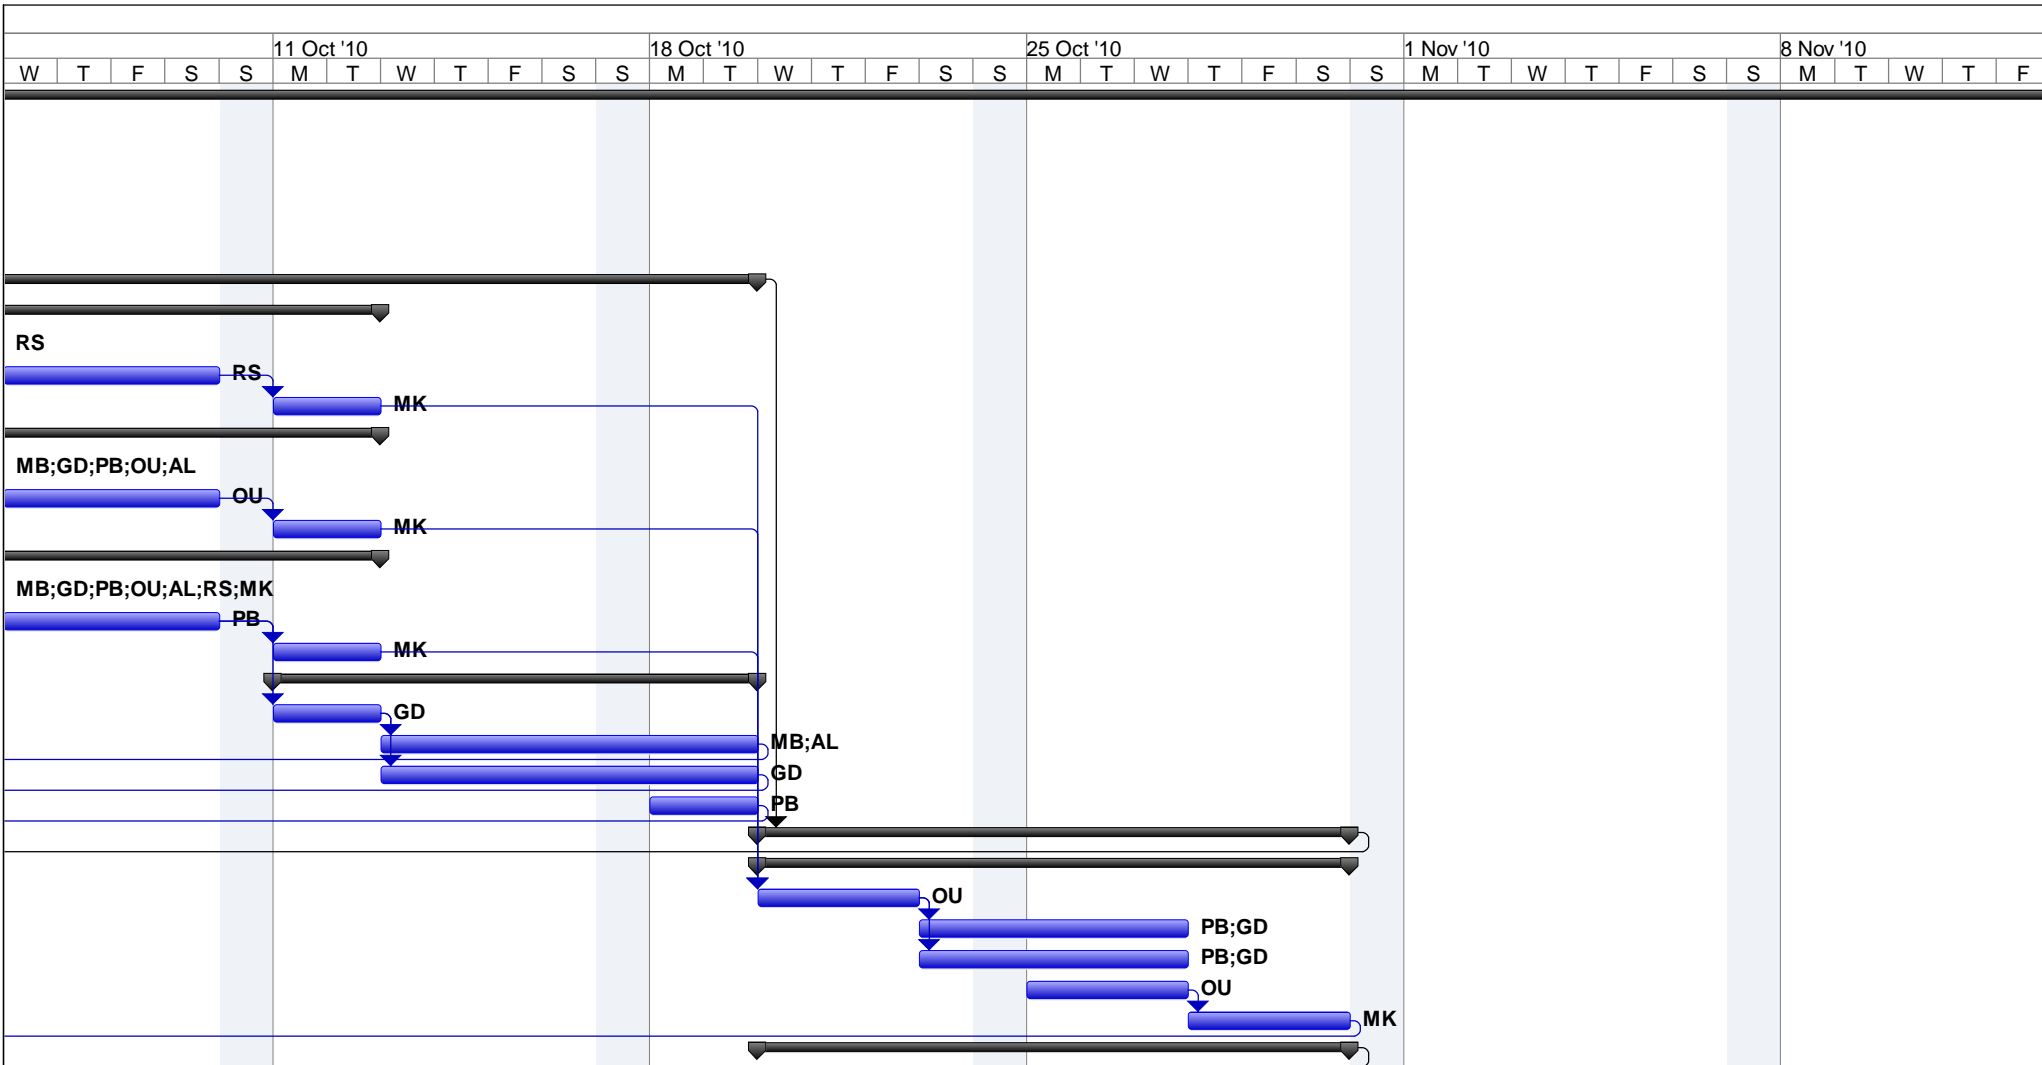


Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

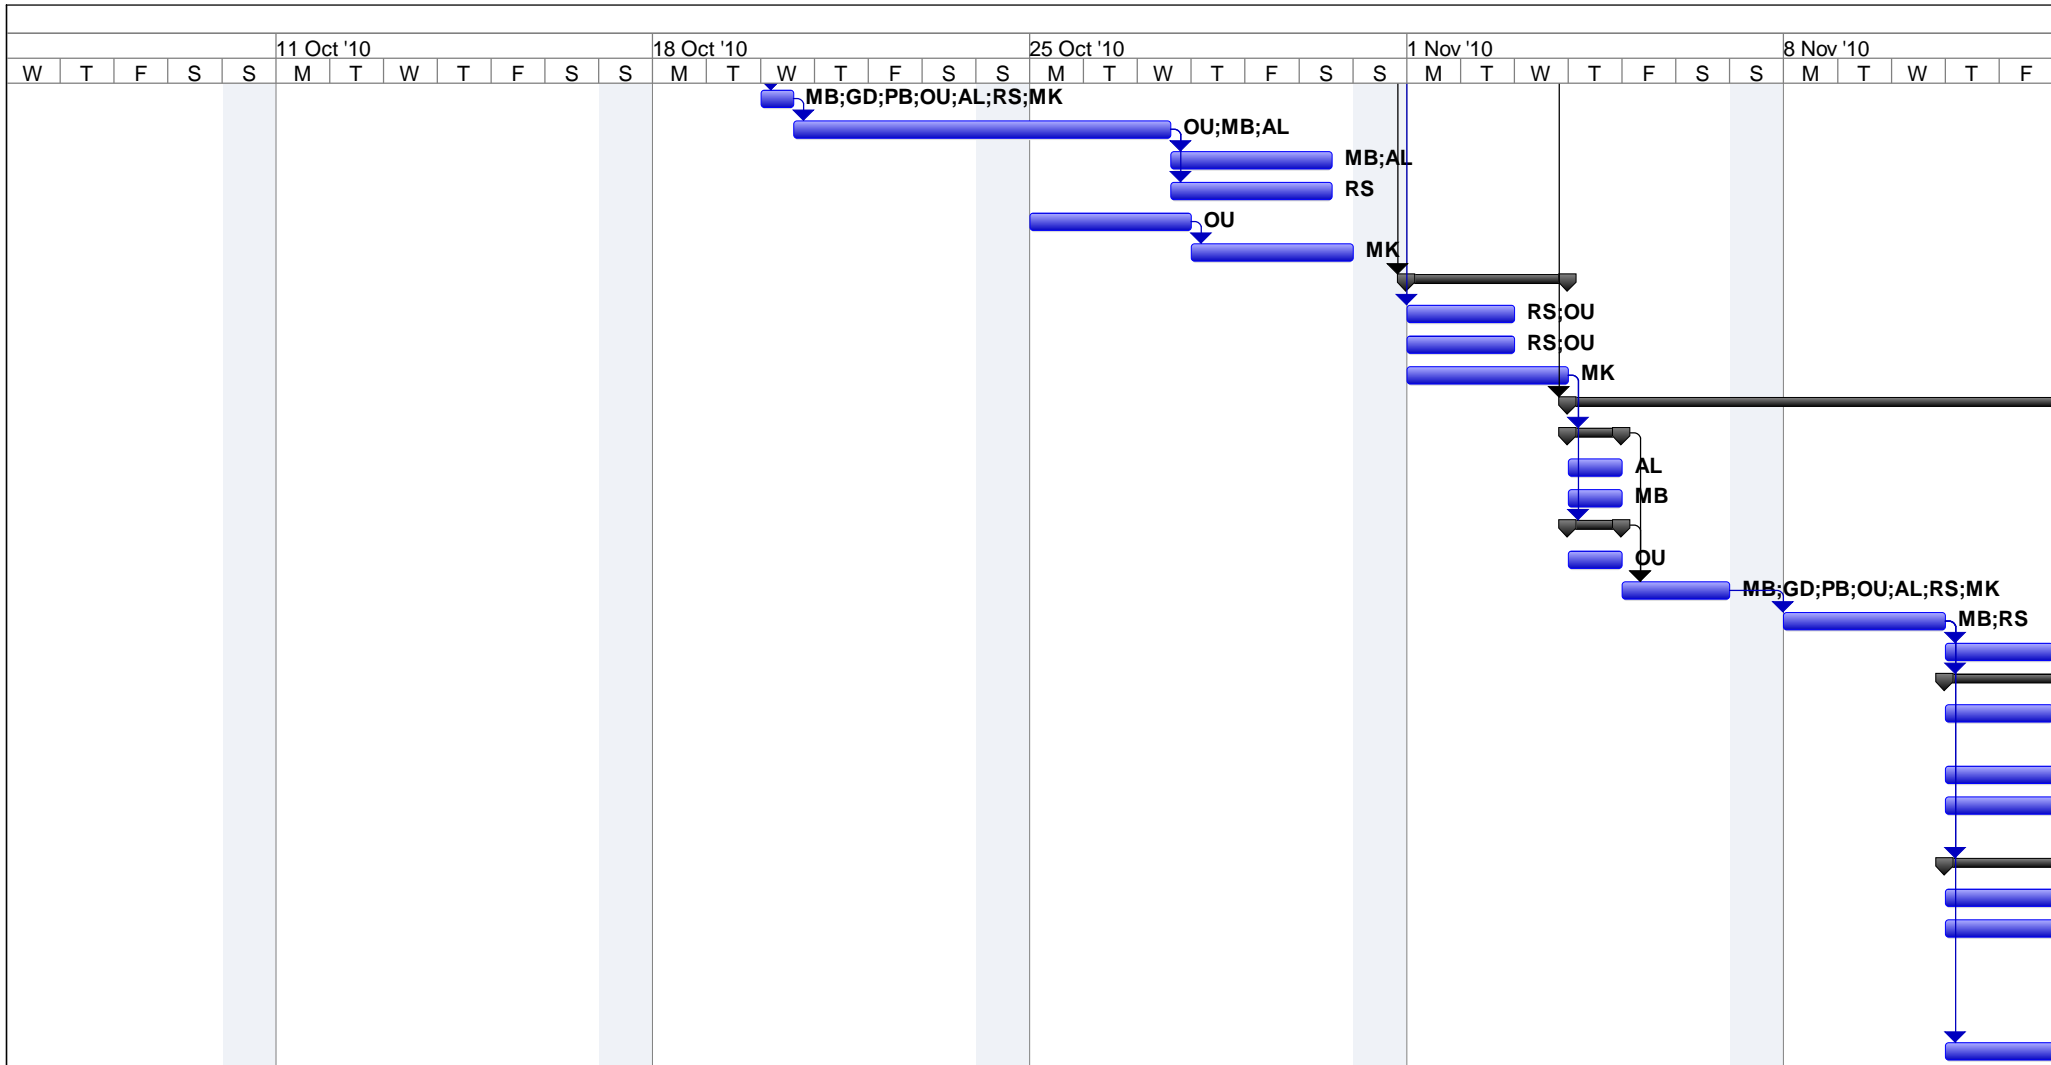


Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

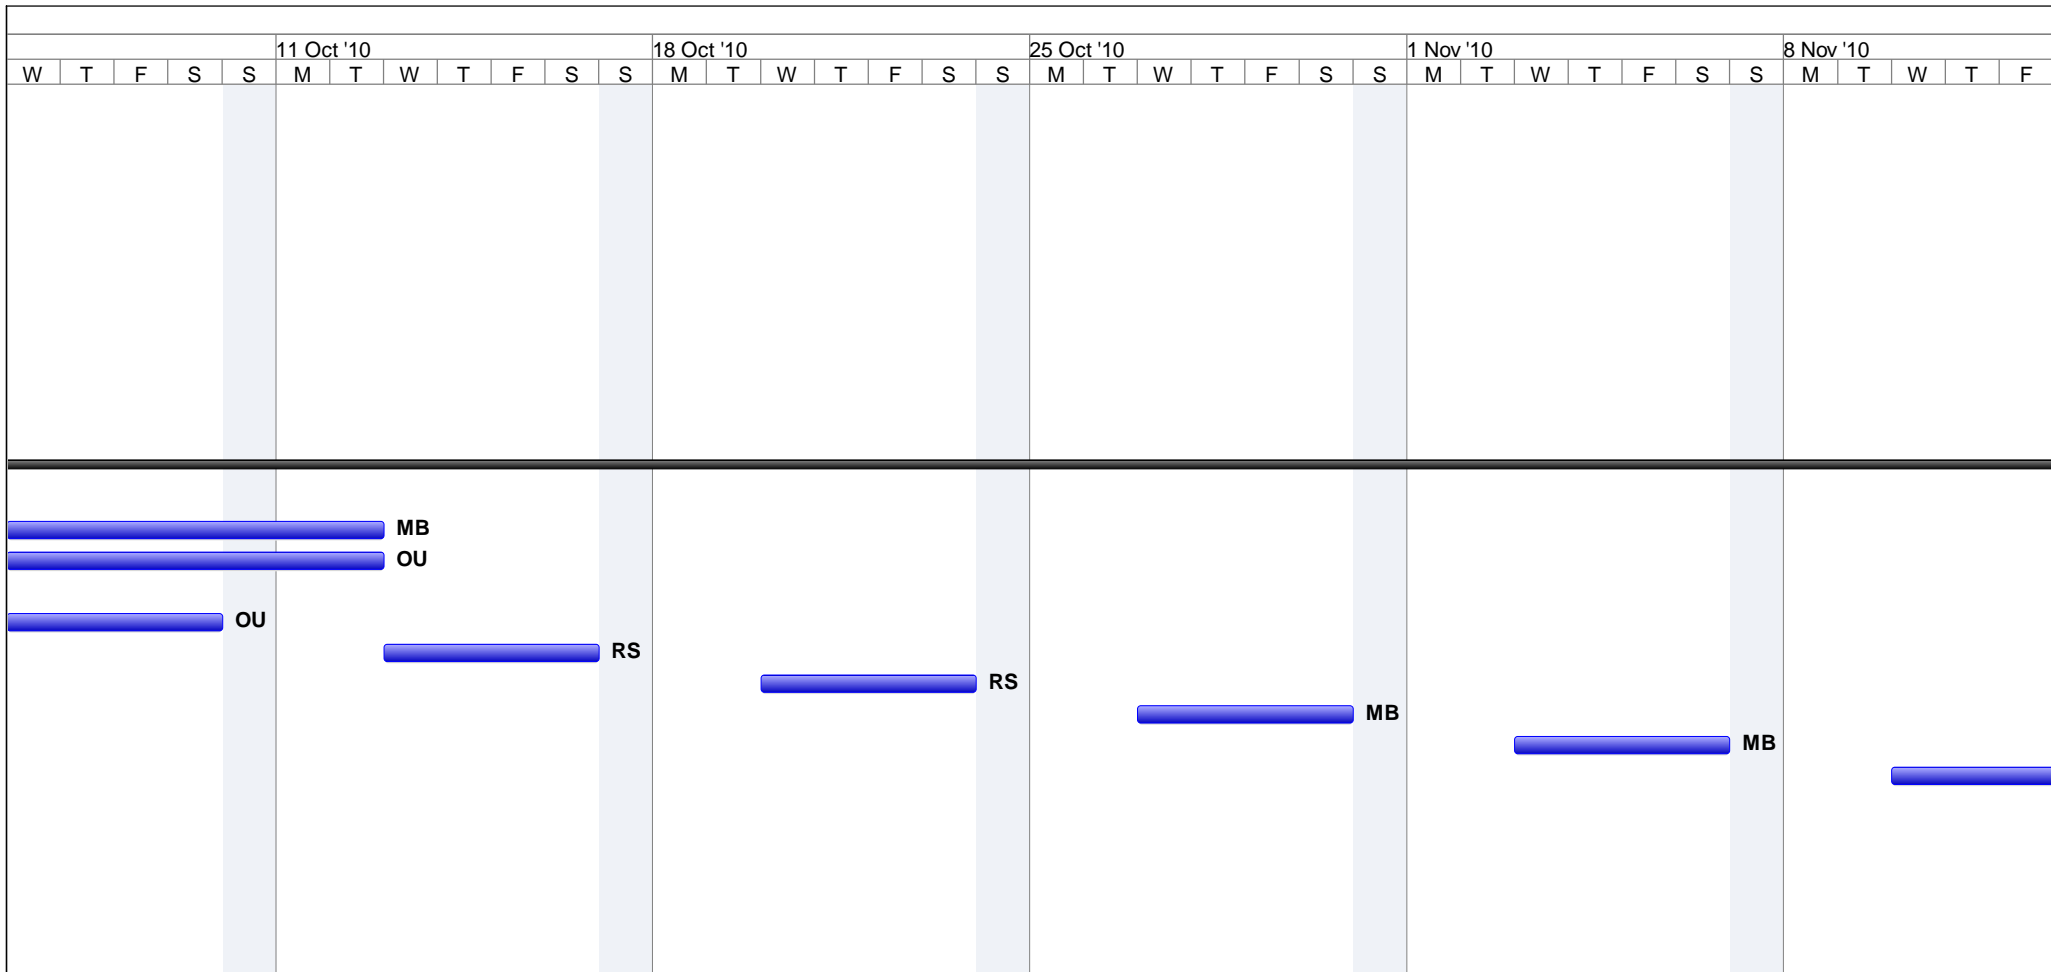


Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	




Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

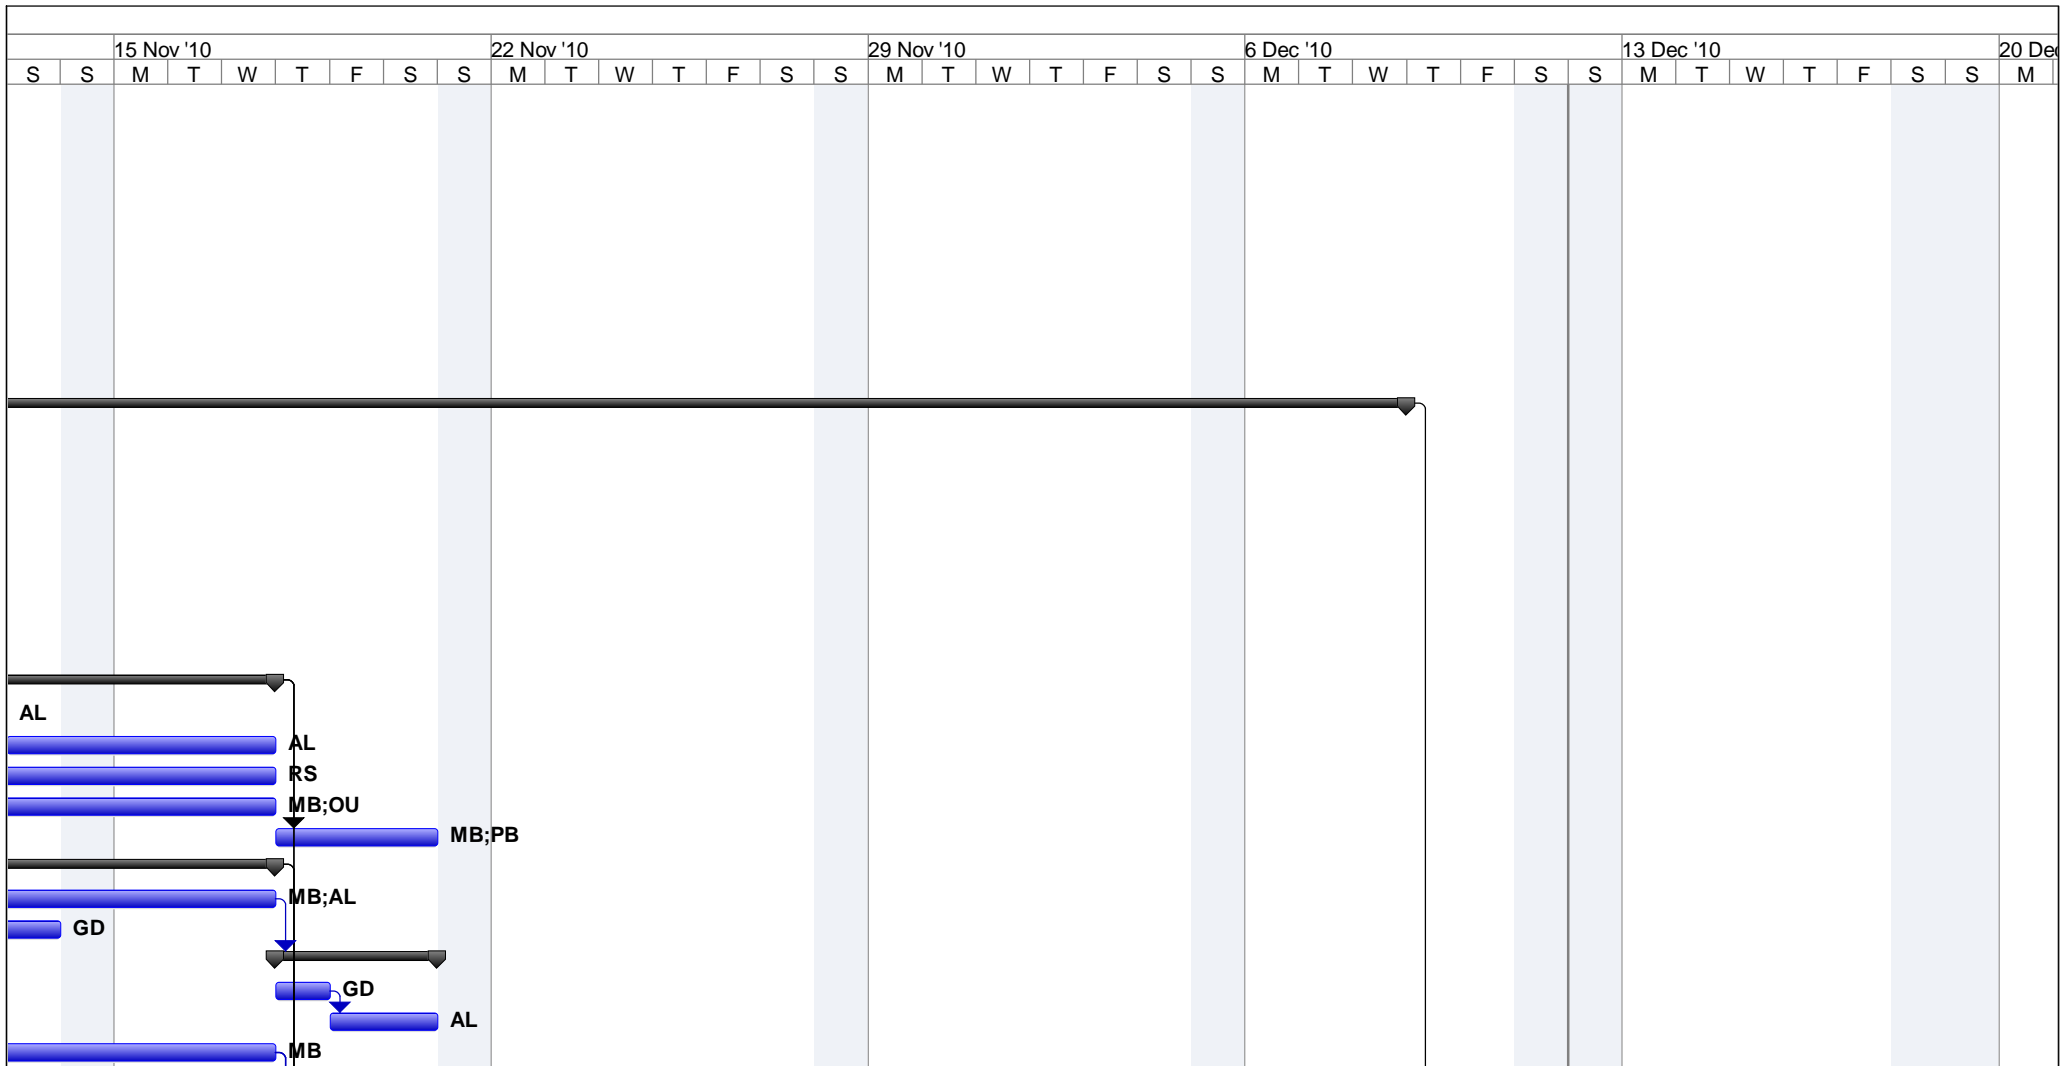

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	

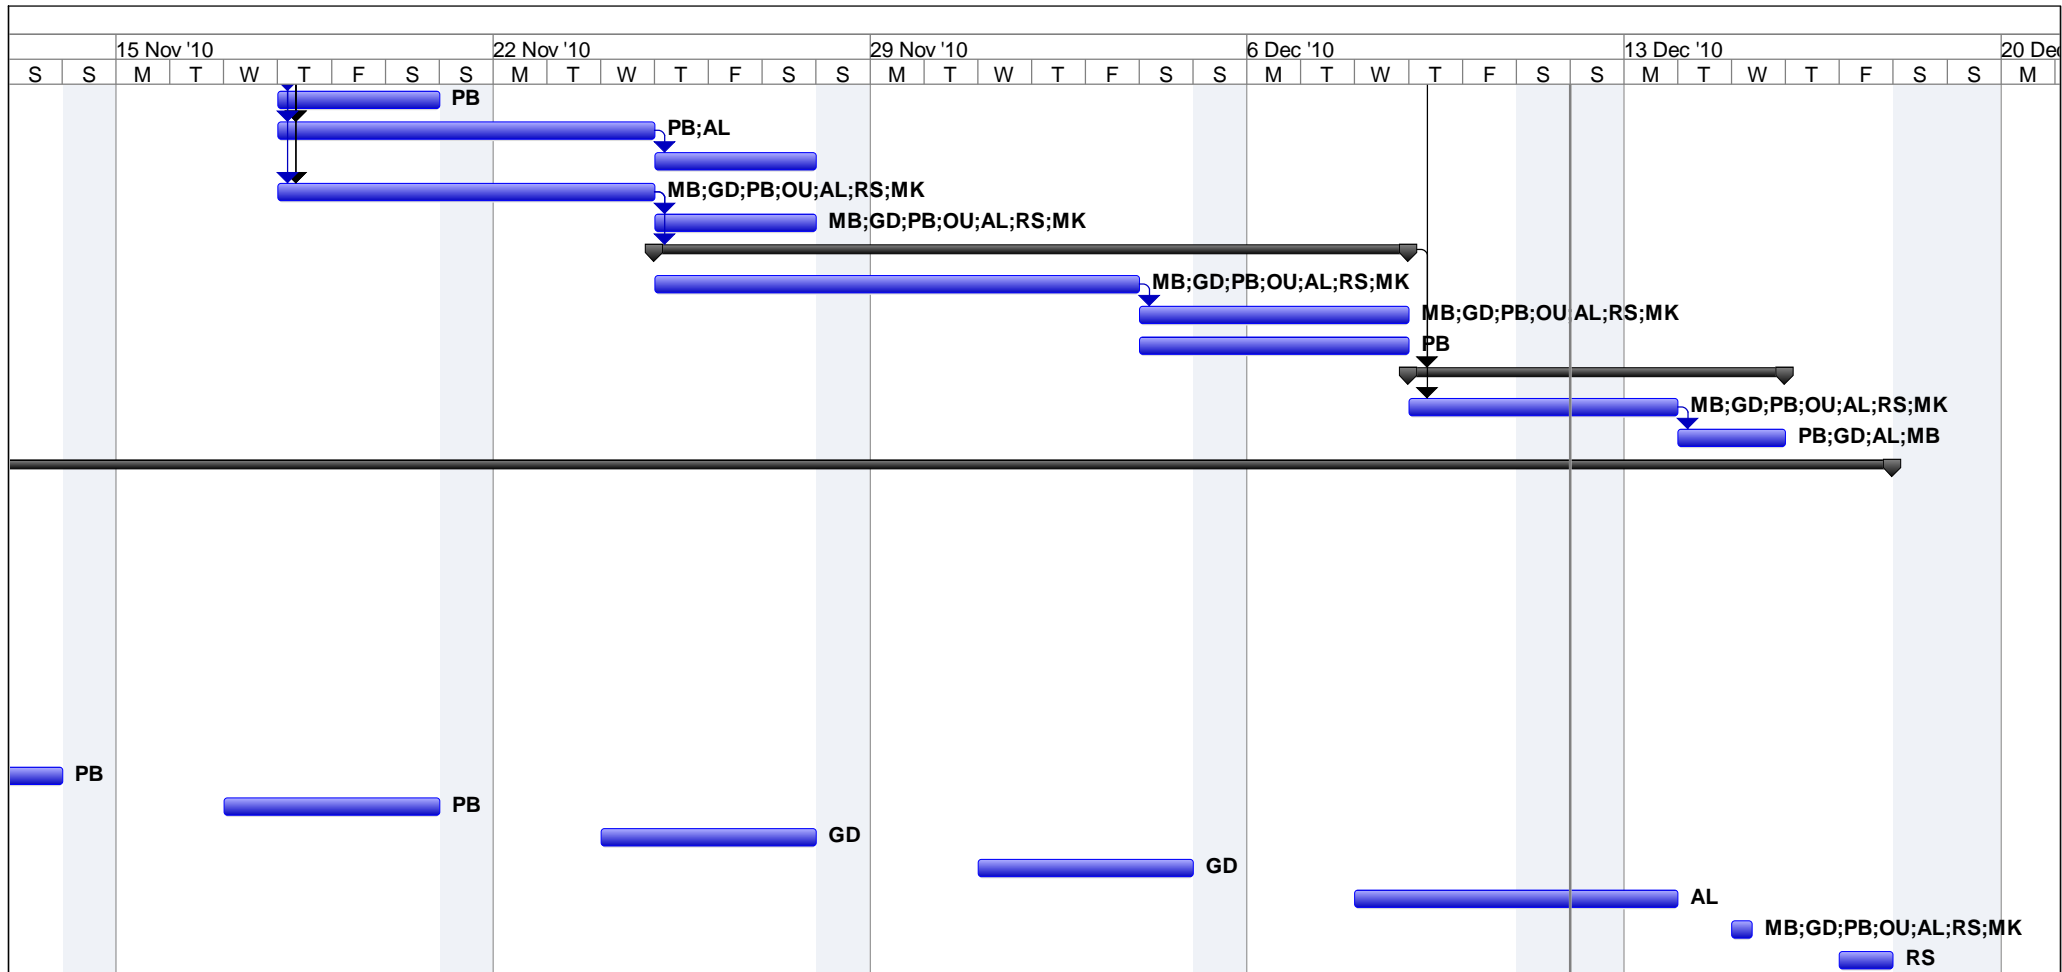

Project: ProjektovýPlán-TrénerMentálny
Date: Sun 12.12.10

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Progress	
External Tasks		Duration-only		Deadline	
