

# Zápisnica pre stretnutie č.10

Téma stretnutia: Šprint review, retrospektíva a plánovanie piateho šprintu

---

**Prítomní:** Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu)  
Bc. Michal Polák  
Bc. Michal Selický  
Bc. Michal Števuliak  
Bc. Marek Števuliak  
Bc. Martin Fukas  
Bc. Nghia Pham Van  
Bc. Ľubomír Samotný

**Neprítomní:**

**Zapisovateľ:** Bc. Nghia Pham Van  
**Miesto stretnutia:** FIIT STU, miestnosť 4.26  
**Dátum stretnutia:** 28.11.2017

---

Priebeh stretnutia:

## 1 Šprint review

- Dokumentácia riadenia:
  - Roly členov tímu: zápiskov na dokumentovanie (zápisky sú činnosť), code conventions na kvalitu
  - Buď celé zmeniť na činnosti alebo manažmenty a potom činnosti v zátvorke vymenovať
  - Plánovanie - napr. Uviesť že sme postupovali metodikou scrumu a konkrétnejšie - máme backlog ktorý sa priebežne naplňuje - kto tam pridával úlohy, stretnutí sme ich vyberali, ohodnocovali, snažili sme sa zobrať počet úloh podľa velocity, koľkokrát sme sa stretávali, počas semestra sme zaviedli standup cez Slack
  - Manažment stránky tímu - udržiavanie dokumentácie o stave projektu
  - Prevzatia - či product owner akceptoval, nie ktoré boli naplánované. Aby bolo vidieť ktoré sme spravili, ktoré nestihli, ktoré sa preniesli atď
  - Globálna retrospektíva - štatistiky ako napr. Čas, napr. Aj po členoch tímu aj globálne
- Dokumentácia - Inžinierske dielo:
  - Do úvodu pridať že to je v rámci tímového projektu a pridať o čo ho chceme rozšíriť
  - V globálnych cieľoch spomenúť iba to čo sme stihli v zimnom semestri
  - Celkový pohľad - nejaký kontext pridať - s akými systémami komunikuje portál
  - Ku každému registru napísať odsek, čo z neho čerpá, niečo aj o slovensko.digital

- Upraviť diagram komponentov aby bol viac špecifický a odrážal architektúru projektu
  - Viac opísať diagramy tried.
  - Diagramy rozdeliť po vrstvách, bližšie opísať aj atribúty
  - Na začiatku globálneho pohľadu uviesť že to je pôvodný stav v akom sme to prebrali.
  - Moduly konkrétnejšie opísať, hlavné je riešenie. Testy stačí spomenúť a odkázať sa na ne.
- Elastic 6 prináša mnohé zmeny a aj problémy pre nás. Bude potrebné prepísať veľké množstvo kódu a veľa vecí treba úplne prerobiť (napr. Fazety už neexistujú, viaceré agregácie na jednej úrovni už nie sú možné).
  - Plán aktualizácie RoR je zatiaľ na verziu 4. Najnovšia je verzia 5.1 ale tá potrebuje aj vyššiu Ruby verziu.
  - OCR zmlúv z CRZ padá ak bola zmluva naskenovaná a niečo bolo dopísané rukou. Spýtať sa M.Barlu či to oni nejako riešili, inak ošetriť aby sa uložil iba obrázok.
  - Upravenie statických stránok nie je veľmi elegantné, možno to v budúcnosti budeme ďalej riešiť keď budeme upravovať administrátorské rozhranie.

## 2 Výstup zo ScrumDesku

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek.

## Sprint: Zimný semester / Sprint 04 ▾

From Nov 14, 2017 20:30 to Nov 28, 2017 20:30

### Team


Role	Name	Hours (Spent)
TEAM_MEMBER	Marek Števuliak	12.2
TEAM_MEMBER	Martin Fukas	6.95
PRODUCT_OWNER	Michal Barla	0
TEAM_MEMBER	Michal Polák	18
TEAM_MEMBER	Michal Selický	13
TEAM_MEMBER	Michal Števuliak	25.1
SCRUM_MASTER	Nghia Pham van	10.2
PRODUCT_OWNER	Robert Moro	0
TEAM_MEMBER	Ľubomír Samotný	10

### Sprint Overview


Planned			Completed		
Items	Effort	Time	Items	Effort	Time
9	26	80h	8	18	73.45h

### Sprint Backlog

*	ID	Type	Title	Status	Estimate	Spent	Delta
*	239171	User story	Analýza CI	DONE	6h	4.1h	-1.9h
	245019	User story	Aktualizácia Elasticsearchu	IN PROGRESS	29h	22h	-7h
	245099	User story	Plán aktualizácie RoR	DONE	10h	9h	-1h
	248083	User story	SPLIT Parser XML so zmluvami z CRZ	DONE	15h	26.7h	11.7h
	248084	User story	SPLIT Stahovanie z RPO	DONE	9h	17.6h	8.6h
	248085	User story	Aktualizácia Ruby - lokál a tímový server	DONE	2.5h	6.7h	4.2h
	248086	User story	Doriešenie statických stránok	DONE	3h	3.1h	0.1h
	248087	User story	Informácia o dodávateľovi - mockup	DONE	4h	4.4h	0.4h
	248092	User story	Dokumentácia admin rozhrania	DONE	1.5h	1.85h	0.35h
Total					80h	95.45h	15.45h

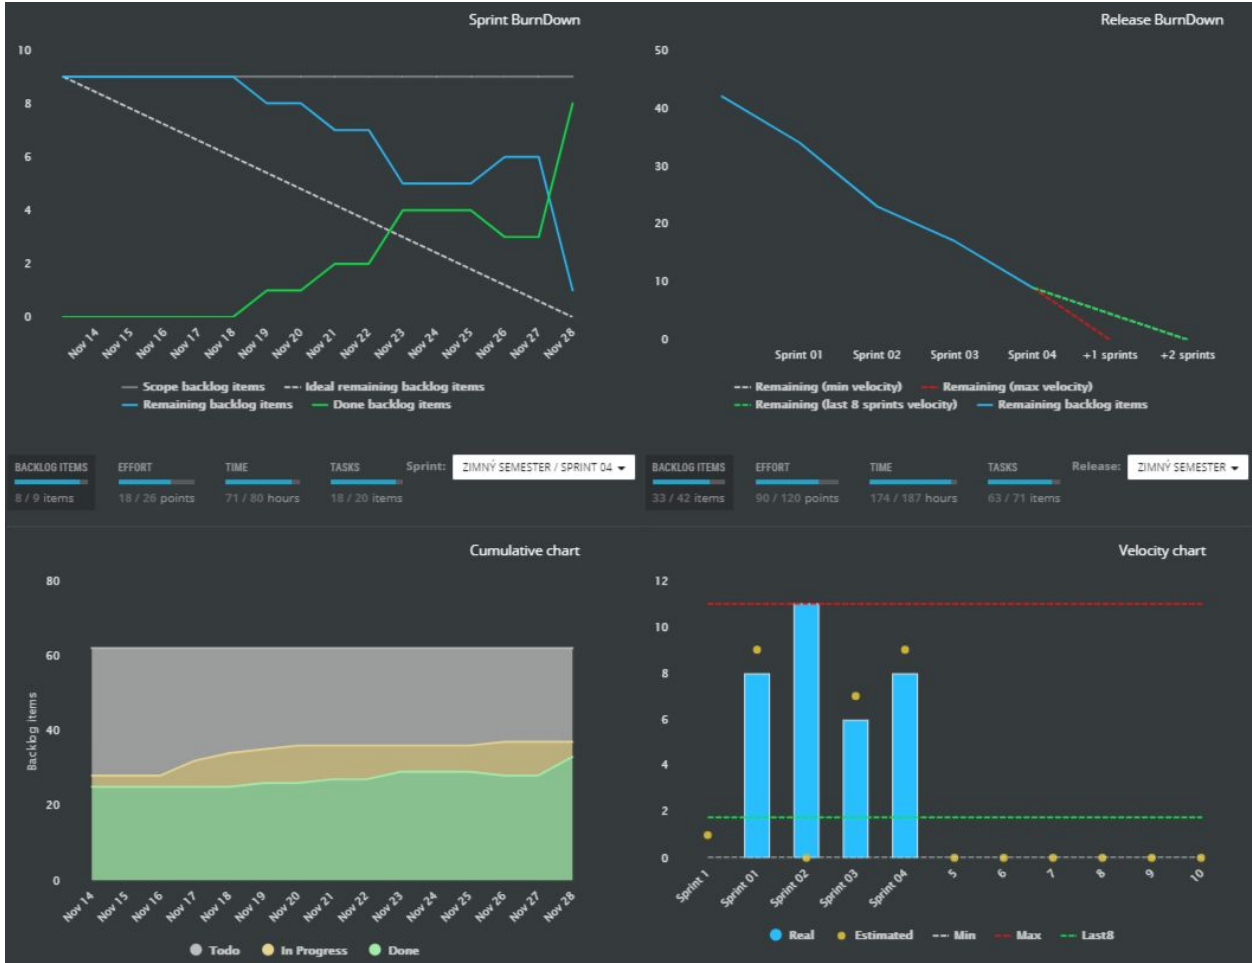

### 3 Retrospektíva

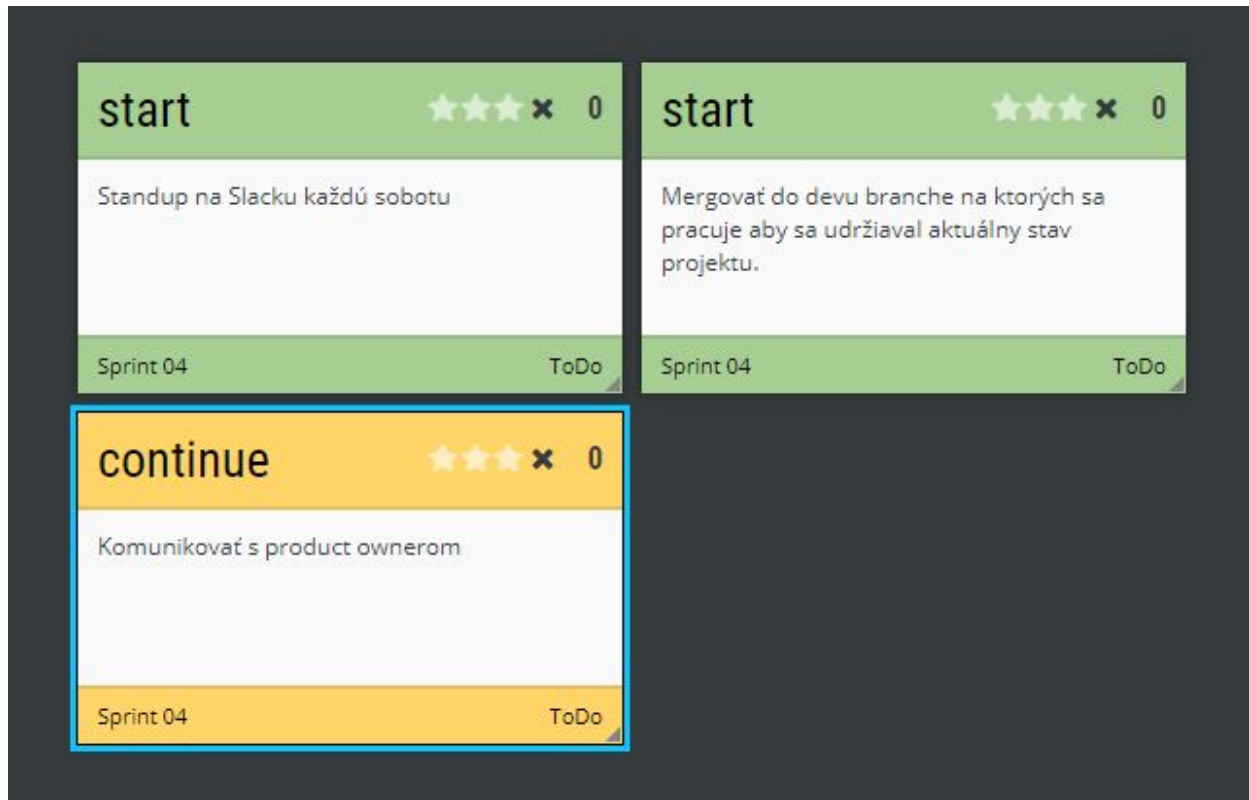

### 4 Šprint Plánovanie

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre piaty šprint:

**Úloha:** Info o subjekte

**Kategória:** User story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Michal Polák, Martin Fukas

**Čo urobiť:**

- Refaktoring backendu
- Napísanie testov
- Zobrazenie na frontende v sidebare namiesto otázok
- Zmeny mockupu

**Úloha:** Aktualizácia RoR po poslednú 4.X verziu

**Kategória:** Infrastructure Story

**Ohodnotená náročnosť:** 5

**Pridelená komu:** Marek Števuliak

**Čo urobiť:**

- Lokálne
- Otestovať
- Na serveri

**Úloha:** Aktualizácia Elastic

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 5

**Pridelená komu:** Ľubomír Samotný, Michal Selický

**Čo urobiť:**

- Rozbehanie search nad documents a pages
- Návrh riešenia faziet

**Úloha:** Setup CI

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 3

**Pridelená komu:** Nghia Pham van

**Čo urobiť:**

- Setup
- Metodika

**Úloha:** Setup automatickej Code Review

**Kategória:** Infrastructure story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Marek Števuliak

**Čo urobiť:**

- Setup
- Aby bola prístupná stránka aj navonok

**Úloha:** Dokumentácia  
**Kategória:** Management story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Nghia Pham van

**Čo urobiť:**

- Dokončiť dokumentáciu riadenia
- Dokončiť dokumentáciu inžinierskeho diela

**Úloha:** Prezentácia na MTS  
**Kategória:** Management story

**Ohodnotená náročnosť:** 1

**Pridelená komu:** Nghia Phamvan

**Čo urobiť:**

**Úloha:** Zrušenie zmluvy CRZ XML  
**Kategória:** User Story

**Ohodnotená náročnosť:** 2

**Pridelená komu:** Michal Števuliak

**Čo urobiť:**

- Zrušenie zmluvy - pole so stavom, dátum
- Evidencia sťahovania v DB - nová tabuľka
- Ošetrovanie chyby Docsplitu pri OCR naskenovanej zmluvy - uloží sa iba obrázok a nepadne to
